

令和4年9月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年9月の進捗状況及び令和4年10月の作業予定について報告します。

1 令和4年9月の進捗状況

以下のとおり作業を実施しました。工程表（9月実績）は別紙のとおりです。

(1) 躯体工

- ・新設ボックストンネル（作業状況写真 撮影項目1～3）
- ・No.1 ピット（作業状況写真 撮影項目4～5）
- ・No.2 ピット（作業状況写真 撮影項目6～8）

(2) 塗装工

- ・ごみ輸送管（作業状況写真 撮影項目9～10）

2 令和4年10月の作業予定


以下のとおり作業を予定しています。工程表（10月予定）は別紙のとおりです。

(1) 躯体工

- ・No.1 ピット
- ・No.2 ピット

(2) 外構復旧

以 上

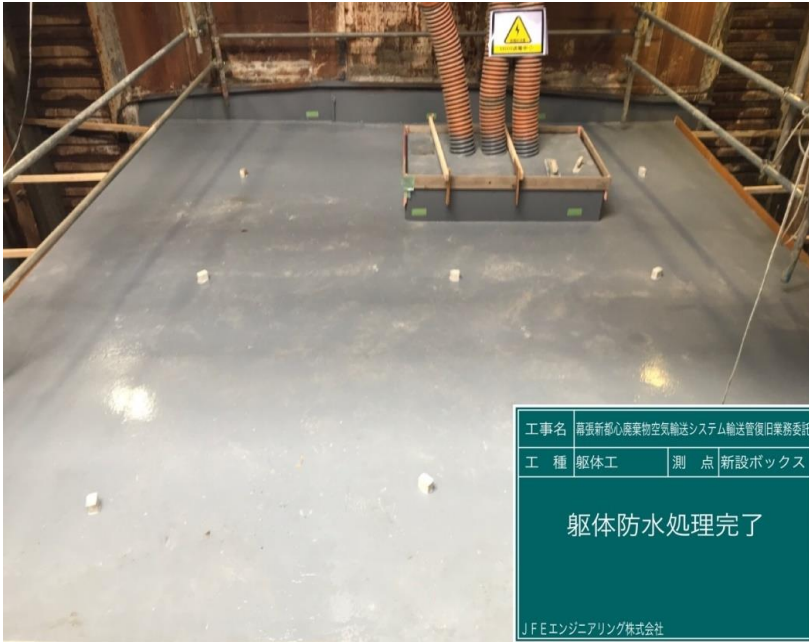

撮影項目 1
 令和4年9月度
 履行報告
 躯体工
 新設ボックス
 スラブ
 躯体防水処理完了状況

 (工事概略図※4)
 (工程表※1)



撮影項目 2
 令和4年9月度
 履行報告
 躯体工
 新設ボックス
 NO,1ピット(下部)
 流動化処理土打設状況

 (工事概略図※4)
 (工程表※1)



撮影項目 3
 令和4年9月度
 履行報告
 躯体工
 NO,1ピット(下部)
 流動化処理土打設完了

 (工事概略図※4)
 (工程表※1)



撮影項目 4

令和4年9月度

履行報告

躯体工

NO,1ピット

壁(下部)

鉄筋組立完了状況

(工事概略図※3)
(工程表※1)



撮影項目 5

令和4年9月度

履行報告

躯体工

NO,1ピット

壁(下部)


コンクリート打設完了状況

(工事概略図※3)
(工程表※1)



工事名	東京新都市廃棄物空輸システム輸送管復旧業務委託	
工種	躯体工	測点 No.2ピット
壁、スラブ 鉄筋組立完了状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 6
 令和4年9月度
 履行報告
 躯体工
 NO,2ピット
 壁、スラブ
 鉄筋組立完了
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)

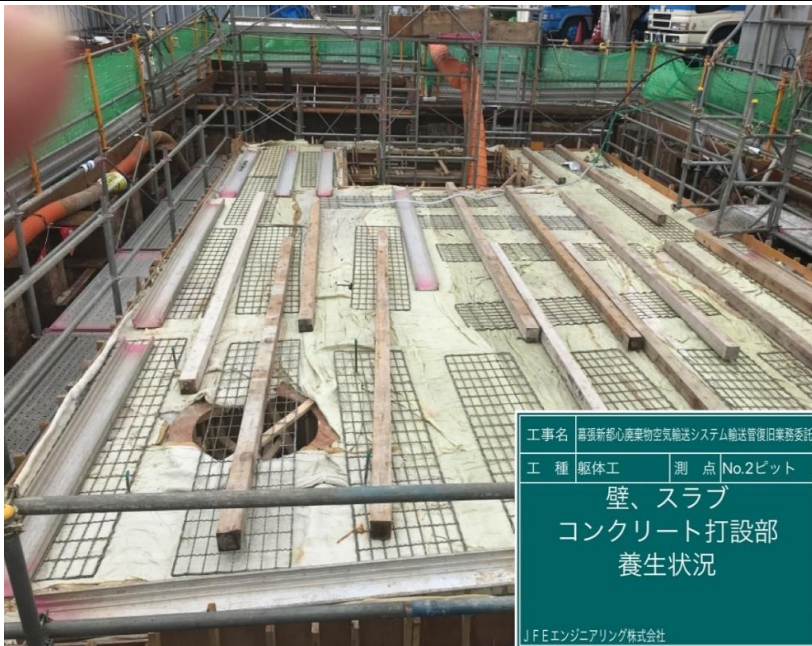


工事名	東京新都市廃棄物空輸システム輸送管復旧業務委託	
工種	躯体工	測点 No.2ピット
壁、スラブ コンクリート打設部 養生状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 7
 令和4年9月度
 履行報告
 躯体工
 NO,2ピット
 壁、スラブ
 コンクリート打設部
 養生状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名	東京新都市廃棄物空輸システム輸送管復旧業務委託	
工種	埋戻工	測点 No.2ピット
流動化処理土打設完了 NO,2ピット(下部)		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 8
 令和4年9月度
 履行報告
 躯体工
 NO,2ピット(下部)
 流動化処理土打設完了
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)

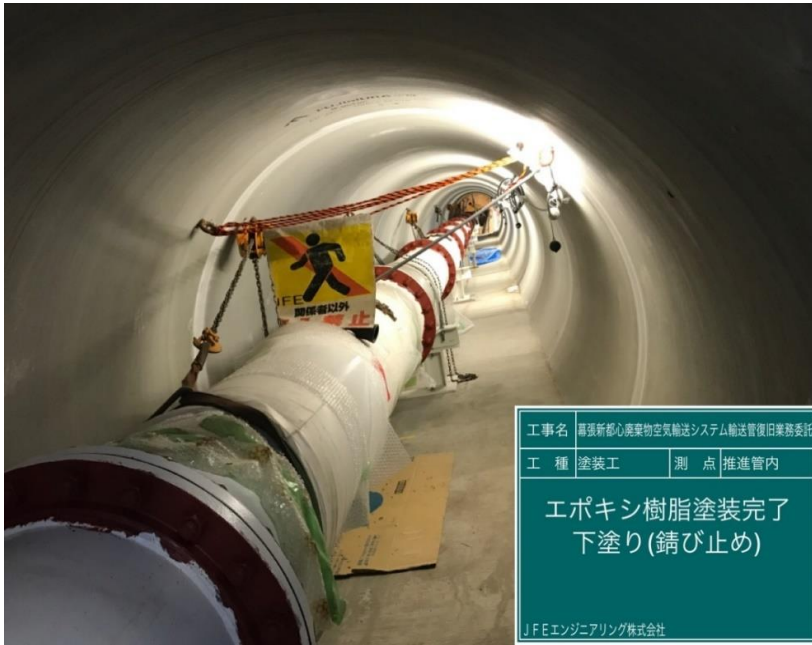

撮影項目 9
 令和4年9月度
 履行報告
 推進管内
 塗装工
 ごみ輸送管
 フランジボルト塗装
 (下塗り)
 (工事概略図※2)
 (工程表※2)




撮影項目 10
 令和4年9月度
 履行報告
 推進管内
 塗装工
 ごみ輸送管
 フランジボルト塗装
 (中塗り)
 (工事概略図※2)
 (工程表※2)

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表 (9月実績・10月予定)

実線：完了、点線：予定

		2022年																															備考																											
No.	項目	9月予定															10月予定																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月												
マイルストーン																																																												
1	躯体工 (※1)																																																											
	新設ボックストンネル部																																																											
	防水工																																																											
	型枠工																																																											
	足場工																																																											
	支保工																																																											
	コンクリート工																																																											
	埋戻し工																																																											
	No1ビット																																																											
	空伏せ工																																																											
	防水工																																																											
	鉄筋工																																																											
	型枠工																																																											
	足場・支保工																																																											
	コンクリート工																																																											
	山留支保工																																																											
	埋戻し工																																																											
	No2ビット																																																											
	空伏せ工																																																											
	鉄筋工																																																											
	型枠工																																																											
	足場工																																																											
	支保工																																																											
	コンクリート工																																																											
	土留撤去																																																											
2	外構復旧																																																											
	埋設部防護コンクリート																																																											
	既設点検ビット解体																																																											
	雨水排水管復旧工																																																											
	汚水管復旧工																																																											
3	塗装工 (※2)																																																											
	配管・架台塗装工																																																											
4	新設配管工																																																											
	新設配管・サポート設置																																																											
	足場一部撤去(共同溝内)																																																											
	No2ビット貫通部リングシール取付																																																											
5	試験立会関係																																																											
	工事立会																																																											
	材料立会																																																											
6	安全関係																																																											
	安全大会																																																											
	災害防止協議会																																																											

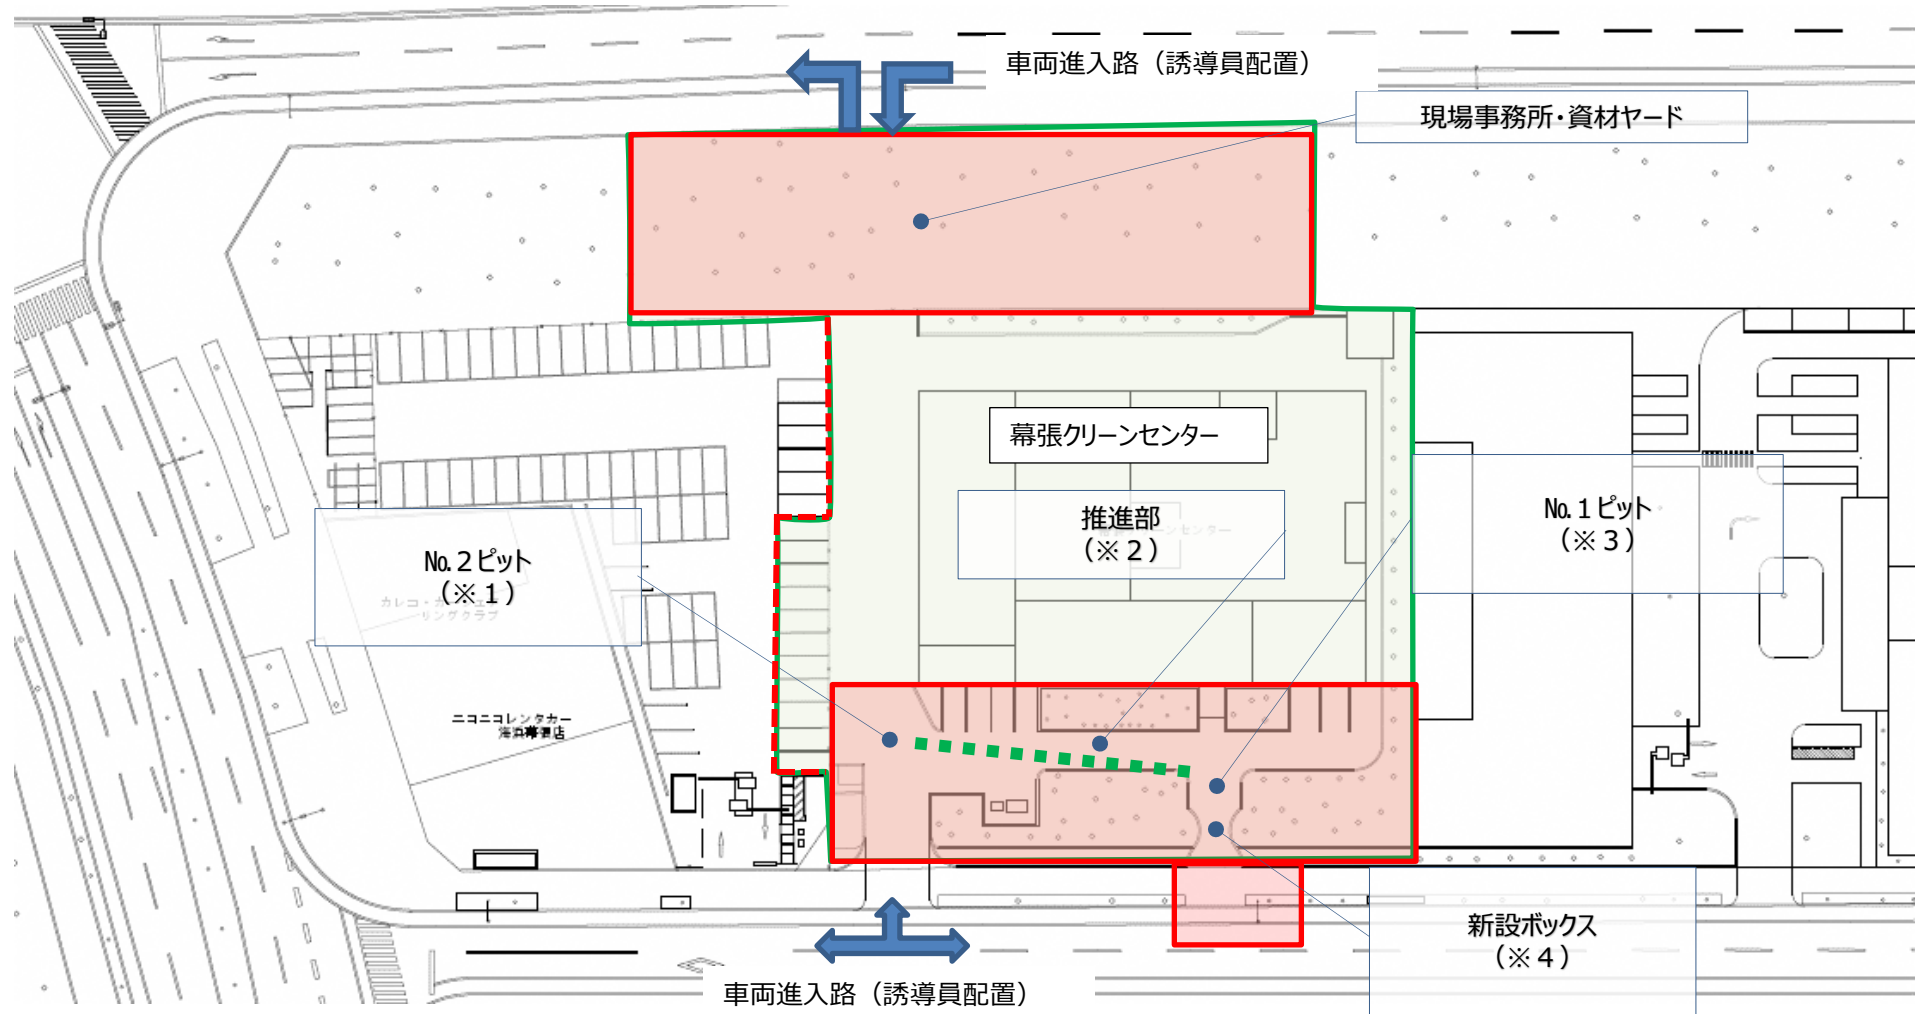

工 事 概 要 図
