

令和3年8月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和3年8月の進捗状況及び9月の作業予定について報告します。

1 8月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（8月実績）は別紙のとおりです。

(1) 準備工（緑地帯）

- ・緑地帯での事務所・資材ヤード造成（作業状況写真 撮影項目1～3）

(2) 準備工（クリーンセンター・歩道部）

- ・植樹撤去（作業状況写真 撮影項目4～5）
- ・仮フェンス設置（付帯作業）（作業状況写真 撮影項目6）

2 9月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（9月予定）は別紙のとおりです。

(1) 準備工（緑地帯）

- ・現場事務所の設置

(2) 準備工（クリーンセンター・歩道部）

- ・ヤード造成、仮囲いの設置
- ・歩道部ガス管試掘調査や既設共同溝探査ボーリング

(3) 準備工（共同溝内）

- ・既設ごみ輸送管一部切断・閉塞蓋設置

以 上

【作業状況写真】



撮影項目 1
令和3年8月度
履行報告
準備工(緑地帯)
資材ヤード
仮囲い完了
(工程表※1)



撮影項目 2
令和3年8月度
履行報告
準備工(緑地帯)
資材ヤード
仮囲い完了
(工程表※1)



撮影項目 3
令和3年8月度
履行報告
準備工(緑地帯)
資材ヤード
敷鉄板設置完了
(工程表※1)



撮影項目 4
令和3年8月度
履行報告
準備工(クリーンセンター・歩道部)
植樹撤去・付帯作業
植樹撤去・仮囲い完了
(工程表※2)



撮影項目 5
令和3年8月度
履行報告
準備工(クリーンセンター・歩道部)
植樹撤去・付帯作業
植樹撤去完了
(工程表※2)



撮影項目 6
令和3年8月度
履行報告
準備工(クリーンセンター・歩道部)
植樹撤去・付帯作業
仮フェンス設置完了
(工程表※2)

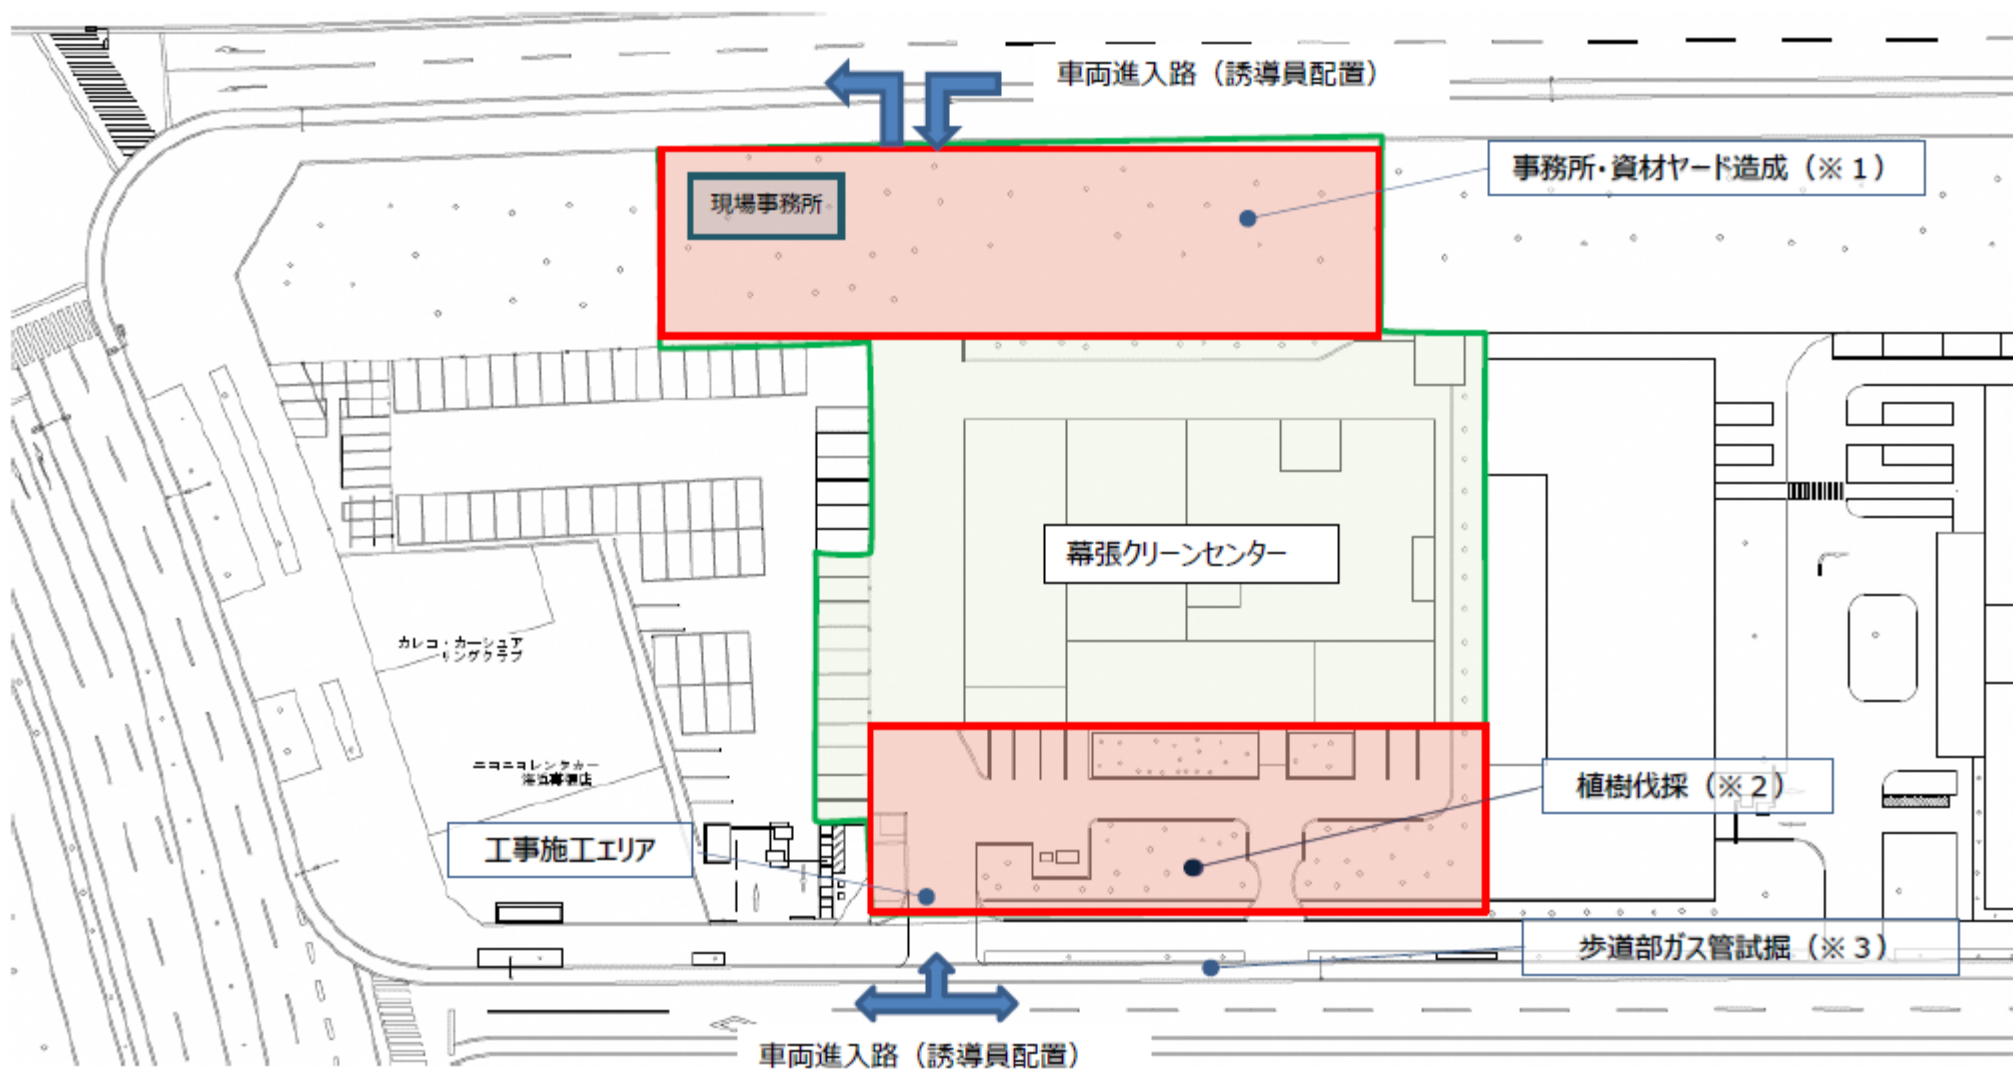


図 1 工 事 概 要 図
