

令和4年11月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年11月の進捗状況及び令和4年12月の作業予定について報告します。

1 令和4年11月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（11月実績）は別紙のとおりです。

(1) 躯体工

- ・No.1 ピット (作業状況写真 撮影項目1～7)

(2) 外構復旧

- ・雨水排水管復旧工 (作業状況写真 撮影項目8)
- ・污水管復旧工 (作業状況写真 撮影項目9)
- ・駐車場境界フェンス復旧 (作業状況写真 撮影項目10)

2 令和4年12月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表(令4年12月予定)は別紙のとおりです。

- (1) 躯体工
- (2) 外構復旧
- (3) 電工

以 上



工事名	南張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	躯体工	測点	No.1ピット
壁(上部) 防水処理完了状況			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 1
令和4年11月度
履行報告
躯体工
No.1ピット
防水処理状況

(工事概略図※1)
(工程表※1)



工事名	南張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	埋戻工	測点	No.1ピット
流動化処理土打設完了 (新設ボックス、 N O,1立坑) 1.5段山留め下まで			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 2
令和4年11月度
履行報告
躯体工
No.1ピット
流動化処理土埋戻状況

(工事概略図※1)
(工程表※1)



工事名	南張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	埋戻工	測点	No.1ピット
流動化処理土打設完了 (新設ボックス、 N O,1立坑) 南側1段山留め下まで			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 3
令和4年11月度
履行報告
躯体工
No.1ピット
流動化処理土埋戻状況

(工事概略図※1)
(工程表※1)



工事名	再張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	躯体工	測点	No.1ピット
昇降設備状況 (踊場設置)			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 4

令和4年11月度

履行報告

躯体工

No.1ピット

昇降設備設置完了

(工事概略図※1)
(工程表※1)



工事名	再張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	躯体工	測点	No.1ピット
壁(上部) プレキャスト蓋設置状況			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 5

令和4年11月度

履行報告

躯体工

No.1ピット

プレキャスト蓋設置状況

(工事概略図※1)
(工程表※1)



工事名	再張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	躯体工	測点	No.1ピット
壁(上部) プレキャスト蓋設置完了			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 6

令和4年11月度

履行報告

躯体工

No.1ピット

プレキャスト蓋設置状況

(工事概略図※1)
(工程表※1)



撮影項目 7

令和4年11月度

履行報告

躯体工

No.1ピット

山留撤去状況

(工事概略図※1)
(工程表※1)



撮影項目 8

令和4年11月度

履行報告

外構復旧

雨水排水管復旧工

雨水排水管布設状況

(工事概略図※2)
(工程表※2)



撮影項目 9

令和4年11月度

履行報告

外構復旧

污水管復旧工

污水管布設状況

(工事概略図※2)
(工程表※2)



撮影項目 10

令和4年11月度

履行報告

外構復旧

駐車場側フェンス復旧


フェンス基礎
コンクリート打設状況

(工事概略図※2)
(工程表※2)

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表 (11月実績・12月予定)

実線:完了、点線:予定

		2022年																															備考																														
		11月実績															12月予定															備考																															
No	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							
マイルストーン																																																															
1	躯体工 (※1)																																																														
	NO1ピット																																																														
	山留支保工																																																														
	防水工																																																														
	鉄筋工																																																														
	型枠工																																																														
	足場・支保工																																																														
	コンクリート工																																																														
	埋戻し工																																																														
	付帯設備																																																														
	No2ピット																																																														
	埋戻し工																																																														
	付帯設備																																																														
	新設ボックストンネル部																																																														
	埋戻し工																																																														
2	外構復旧 (※2)																																																														
	雨水排水管復旧工																																																														
	污水管復旧工																																																														
	駐車場境界フェンス復旧																																																														
	L型側溝																																																														
	仮囲い撤去																																																														
	舗装工																																																														
	街灯復旧																																																														
	歩道境界ブロック																																																														
	ゲート設備設置																																																														
	駐車場内舗装他																																																														
	北側 仮設ヤード関係																																																														
	事務所撤去																																																														
	盛土																																																														
3	電気																																																														
	NO1ピット 排水ピット動力																																																														
	NO2ピット 排水ピット動力																																																														
	照明関係																																																														
4	事務所撤去																																																														
	事務所撤去																																																														
5	安全関係																																																														
	安全大会																																																														
	災害防止協議会																																																														

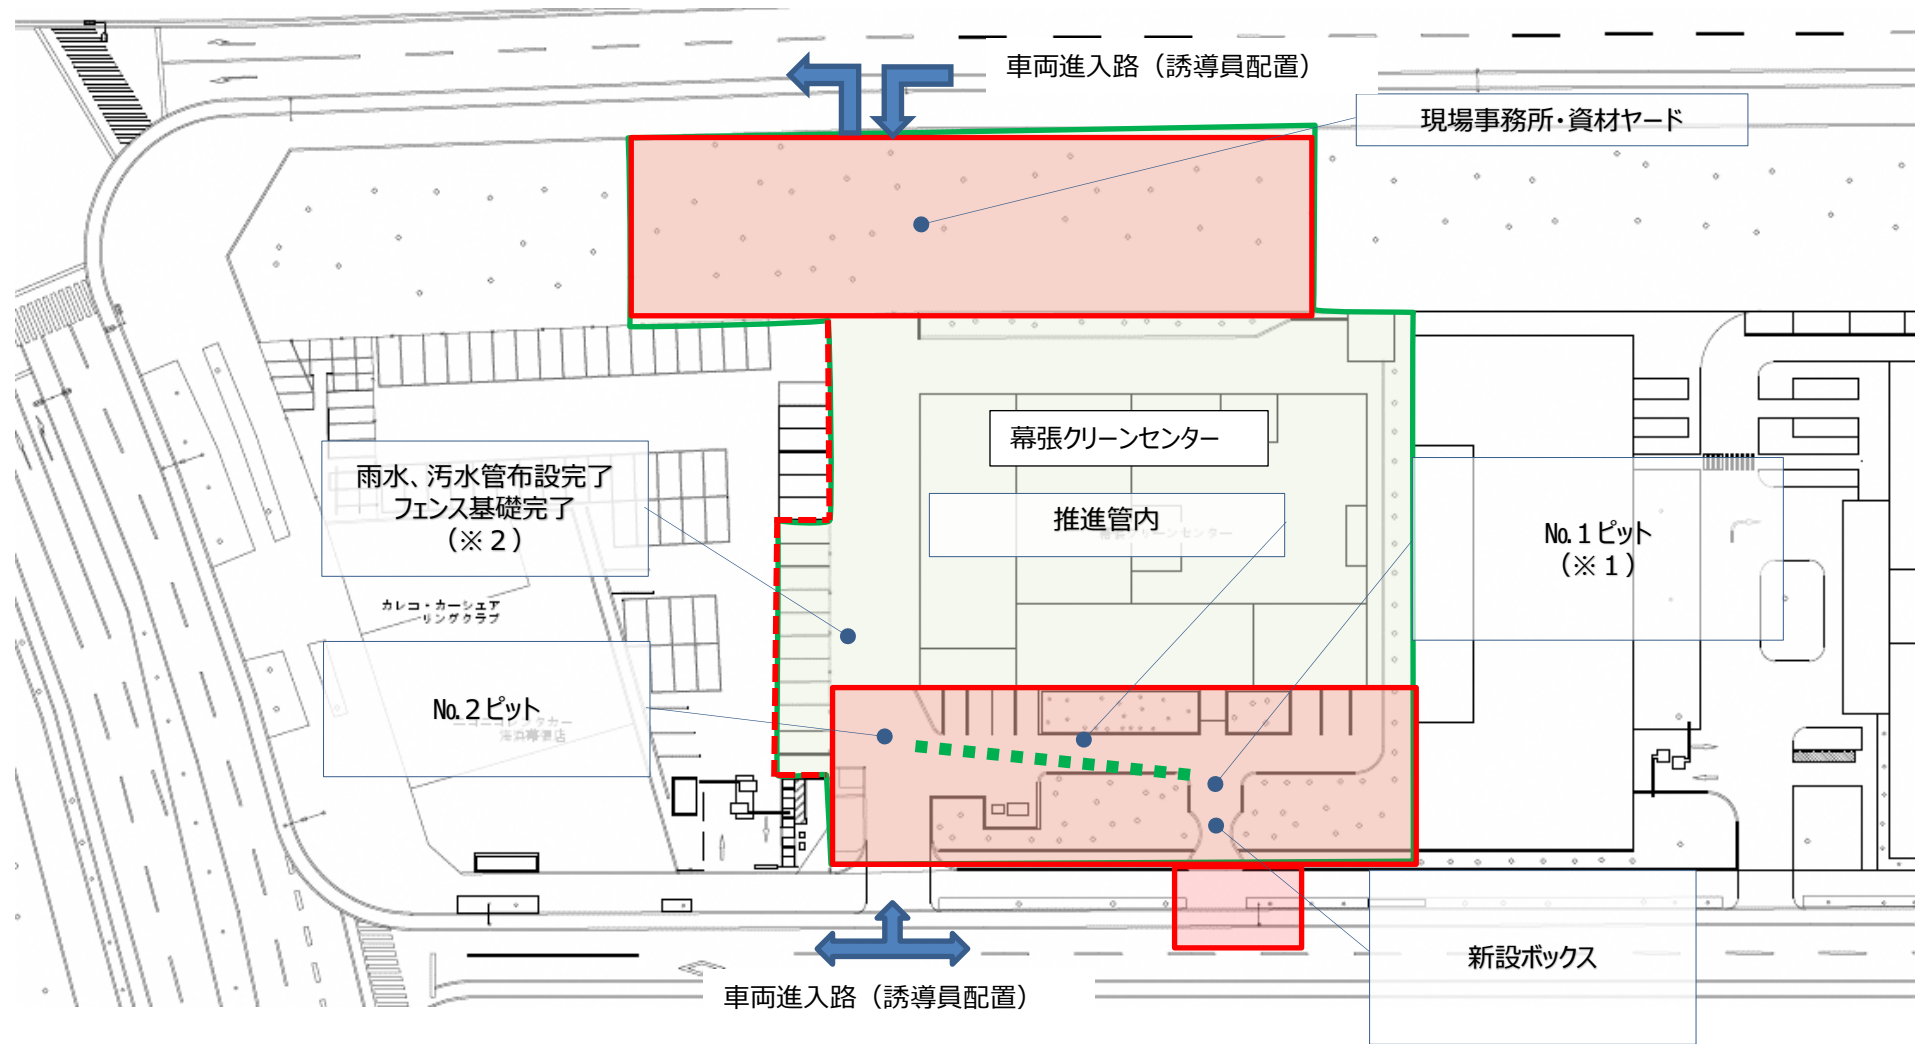

工 事 概 要 図
