

## 令和3年12月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和3年12月の進捗状況及び令和4年1月の作業予定について報告します。

### 1 12月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（12月実績）は別紙のとおりです。

#### (1) 土留工（立坑構築工）

- ・No.1ピット親杭打設工（作業状況写真 撮影項目1～3）
- ・No.1、2ピット 一次掘削工（作業状況写真 撮影項目4～5、8）
- ・No.1、2ピット 覆土工（作業状況写真 撮影項目6～7、9～11）

#### (2) 地盤改良工

- ・北側ヤードプラント設置（作業状況写真 撮影項目12～14）
- ・No.1、2ピット 試験注入

### 2 令和4年1月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（令和4年1月予定）は別紙のとおりです。

#### (1) 地盤改良工

- ・No.1、2ピット 地盤改良

以 上



【作業状況写真】



撮影項目 1  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.1ピット 親杭打設工  
 油圧バイプロ打設  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 2  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.1ピット 親杭打設工  
 油圧バイプロ打設  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 3  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.1ピット 親杭打設工  
 油圧バイプロ打設  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 4

令和3年12月度

履行報告

土留工(立坑構築工)

No.1ピット 一次掘削工

掘削状況

(工事概要図※2)  
(工程表※2)



撮影項目 5

令和3年12月度

履行報告

土留工(立坑構築工)

No.1ピット 一次掘削工

掘削状況

(工事概要図※2)  
(工程表※2)



撮影項目 6  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.1ピット 覆土工  
 掘削状況  
 (工事概要図※3)  
 (工程表※3)




撮影項目 7  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.1ピット 覆土工  
 設置完了  
 (工事概要図※3)  
 (工程表※3)



撮影項目 8  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.2ピット 一次掘削工  
 掘削状況  
 (工事概要図※4)  
 (工程表※4)



撮影項目 9  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.2ピット 覆土工  
 (工事概要図※5)  
 (工程表※5)

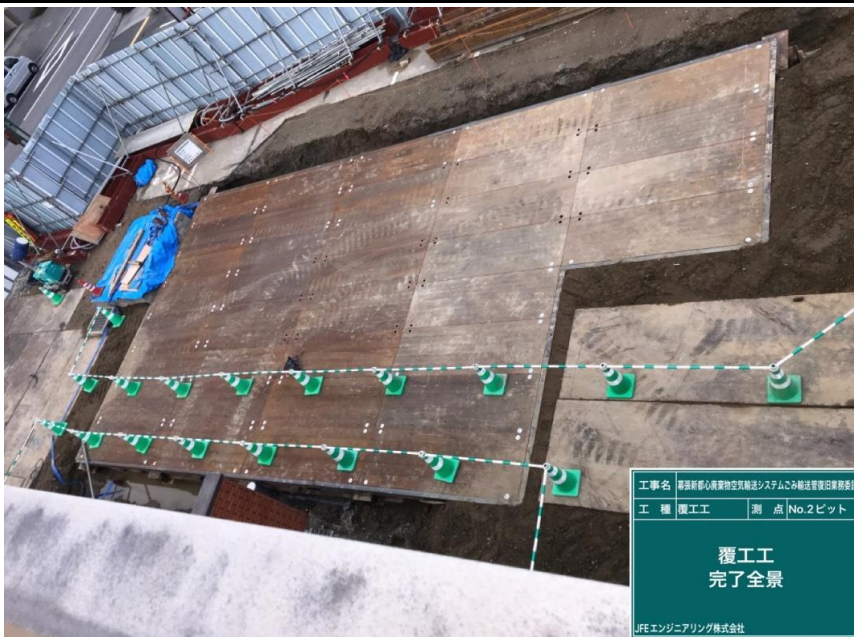

撮影項目 10  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.2ピット 覆土工  
 (工事概要図※5)  
 (工程表※5)



撮影項目 11  
 令和3年12月度  
 履行報告  
 土留工(立坑構築工)  
 No.2ピット 覆土工  
 (工事概要図※5)  
 (工程表※5)



工事名	厚狭新駅心臓部物空輸送システムこみ輸送管復旧業務委託	
工種	地盤改良工	測点 北側ヤード
<b>地盤改良工 プラント設置工 プラント組立状況</b>		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 12

令和3年12月度

履行報告

地盤改良工

北側ヤード

プラント設置状況

(工事概要図※6)  
(工程表※6)



工事名	厚狭新駅心臓部物空輸送システムこみ輸送管復旧業務委託	
工種	地盤改良工	測点 北側ヤード
<b>地盤改良工 プラント全景</b>		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 13

令和3年12月度

履行報告

地盤改良工

北側ヤード

プラント設置全景

(工事概要図※6)  
(工程表※6)



工事名	厚狭新駅心臓部物空輸送システムこみ輸送管復旧業務委託	
工種	地盤改良工	測点 北側ヤード
<b>地盤改良工 プラント全景</b>		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 14

令和3年12月度


履行報告

地盤改良工

北側ヤード

プラント設置全景

(工事概要図※6)  
(工程表※6)

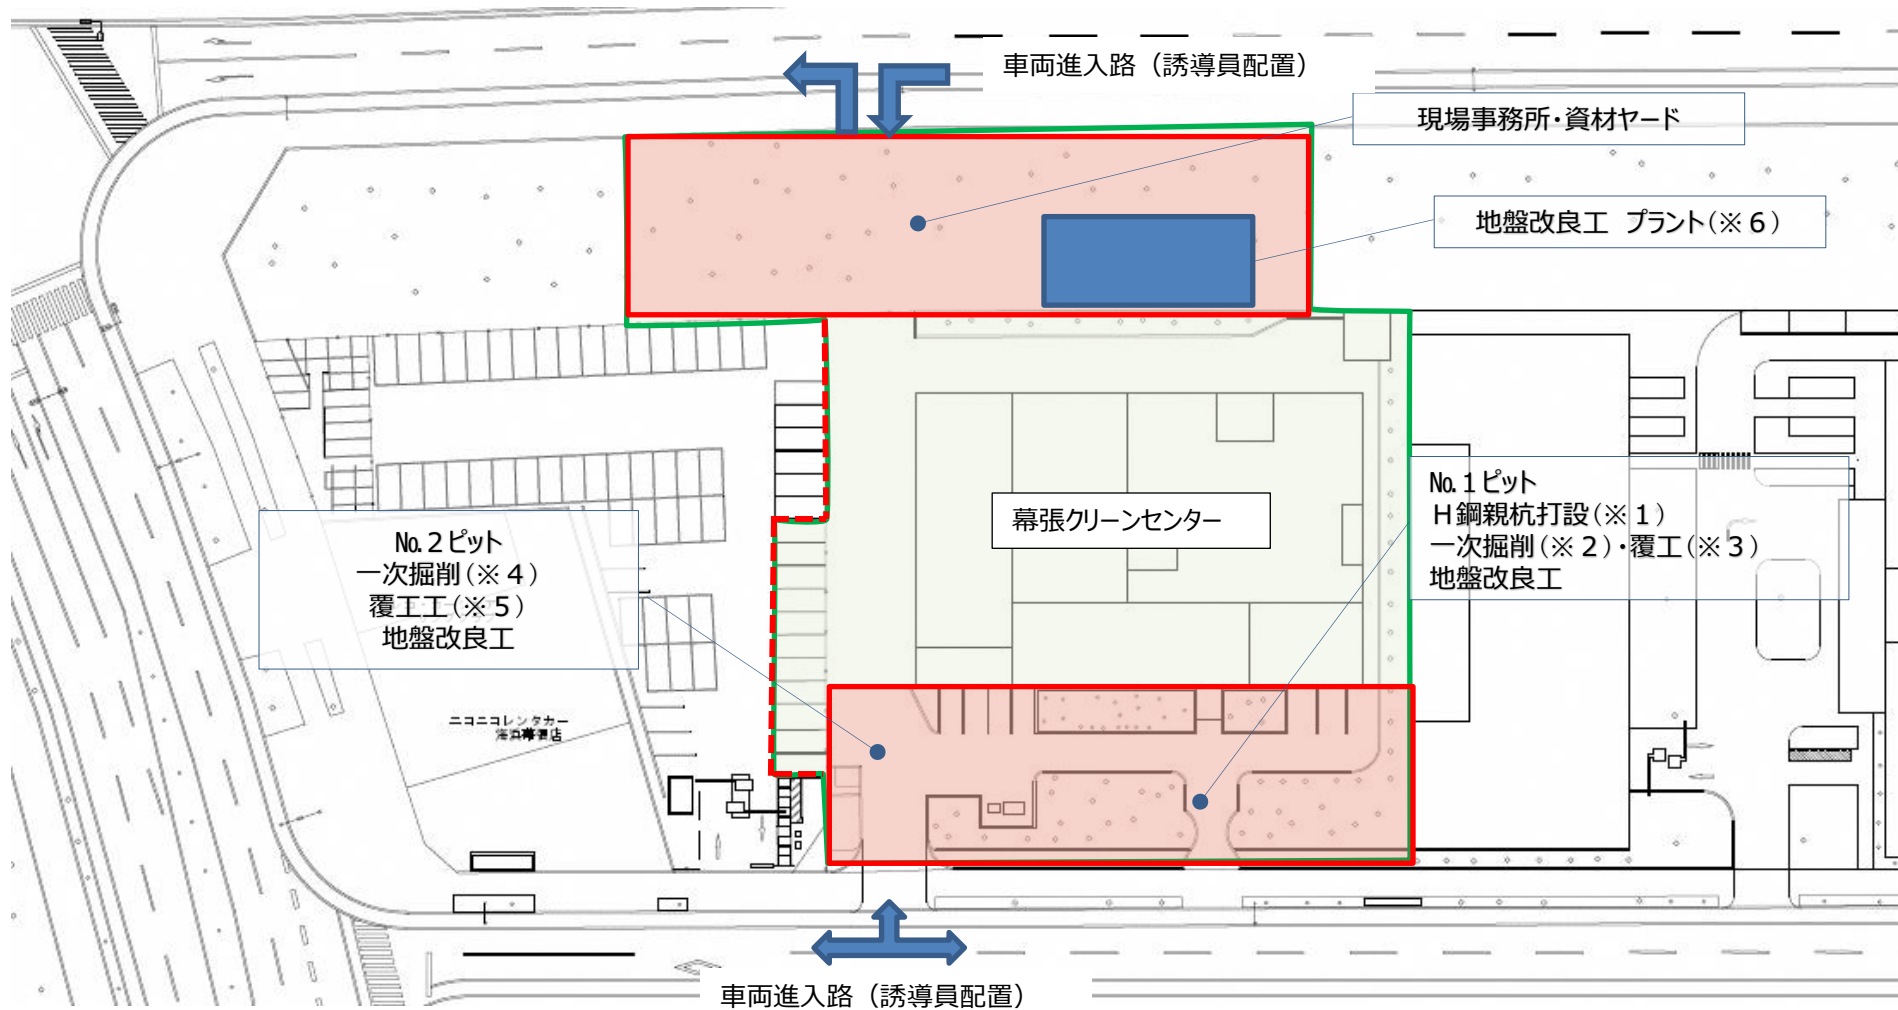

工 事 概 要 図
