

令和3年8月11日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和3年7月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和3年7月の進捗状況及び8月の作業予定について報告します。

1 7月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（7月実績）は別紙のとおりです。

(1) 準備工（緑地帯）

- ・植樹伐採・撤去（作業状況写真 撮影項目1）、植栽搬出

(2) 準備工（クリーンセンター内）

- ・調査ボーリング（作業状況写真 撮影項目2）
- ・植樹伐採・撤去、植栽搬出

2 8月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（8月予定）は別紙のとおりです。

(1) 準備工（緑地帯）

- ・緑地帯でのヤード造成や現場事務所の設置

(2) 試験立会関係

- ・地盤改良に先立って試験場での強度試験（配合試験）の実施

以 上

【作業状況写真】



撮影項目1

令和3年7月度

履行報告

緑地帯 植樹撤去(伐根)工

北側

(工程表※1)



撮影項目2


令和3年7月度

履行報告

CC場内 調査ボーリング

(工程表※2)

車両進入路（誘導員配置）

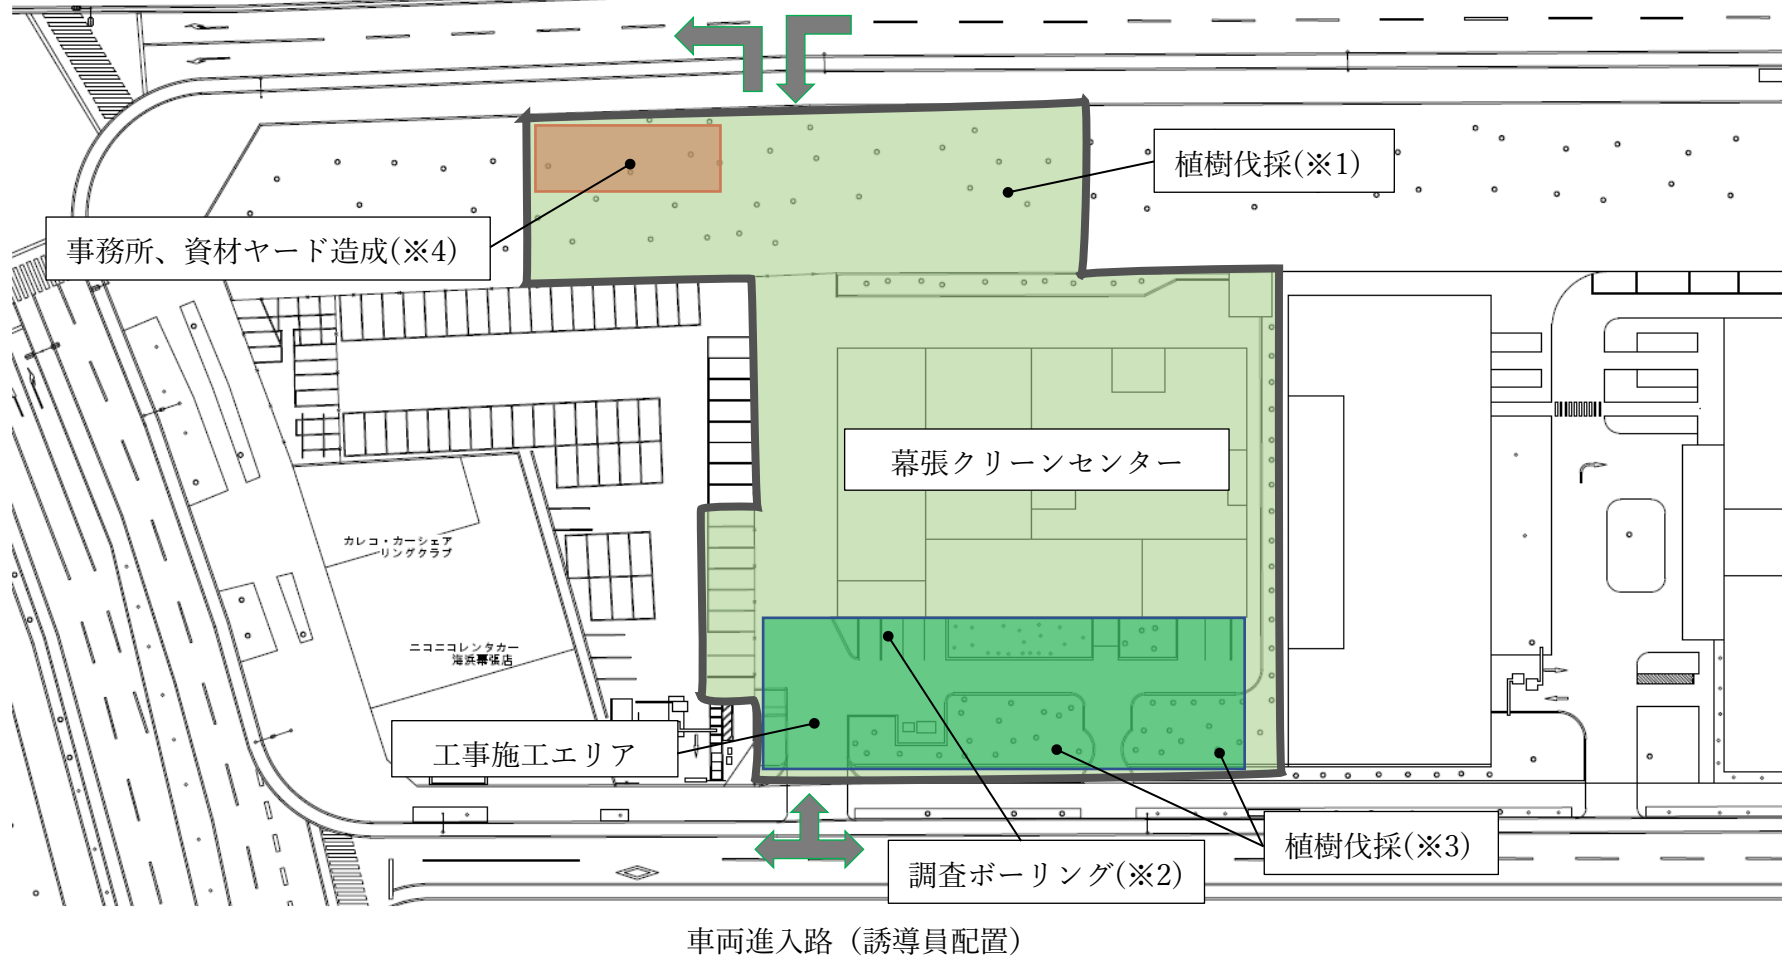

車両進入路（誘導員配置）

図1 工事概要図
