

令和4年4月12日  
千葉県環境局資源循環部  
廃棄物施設維持課

## 令和4年3月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年3月の進捗状況及び令和4年4月の作業予定について報告します。

### 1 3月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（3月実績）は別紙のとおりです。

#### (1) 掘削工（立坑構築工）

・No.1ピット

（作業状況写真 撮影項目1～6）

#### (2) 配管工

・現地工事

（作業状況写真 撮影項目7～9）

### 2 4月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（4月予定）は別紙のとおりです。

#### (1) 掘削工（立坑構築工）

・No.1ピット

・No.2ピット

#### (2) 躯体工（推進工）

・機材搬入準備、推進工

#### (3) 配管工

・既設配管撤去、搬出

・新設配管設置

以 上

## 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表（3月実績・4月予定）

実線：完了、点線：予定

No.	項目	2022年																														備考
		3月実績															4月予定															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	マイルストーン																															
1	ヤード造成工 (クリーンセンター・歩道部)																															
	ヤード内整備工																															
2	掘削工（立坑構築工）																															
	NO1ビット (※1)																															
	掘削工																															
	土留め支保工																															
	共同溝つま壁撤去																															
	止水対策工																															
	NO2ビット																															
	掘削工																															
	土留め支保工																															
	空伏セコン																															
3	躯体工（推進工）																															
	機材搬入・準備工																															
	推進工																															
	資機材撤去																															
4	配管工																															
	新設配管製作																															
	新設配管製作																															
	新設配管建築																															
	現地工事 (※2)																															
	共同溝内足場組																															
	既設配管撤去・搬出																															
	新設配管設置																															
	足場一部撤去																															
5	試験立会関係																															
	工事立会																															
	材料立会																															
6	安全関係																															
	安全大会																															
	災害防止協議会																															



撮影項目 1  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 掘削工  
 施工状況  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 2  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 掘削工  
 施工状況  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 3  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 掘削工  
 地盤改良材取壊し  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)





撮影項目 4  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 掘削工  
 残土積込搬出  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 5  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 掘削工  
 施工状況  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 6  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 土留め支保工  
 高圧ケーブル吊防護  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)







撮影項目 7  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 配管工  
 現地工事  
 共同溝内足場組  
 足場組立状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)



撮影項目 8  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 配管工  
 現地工事  
 共同溝内足場組  
 足場組立状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

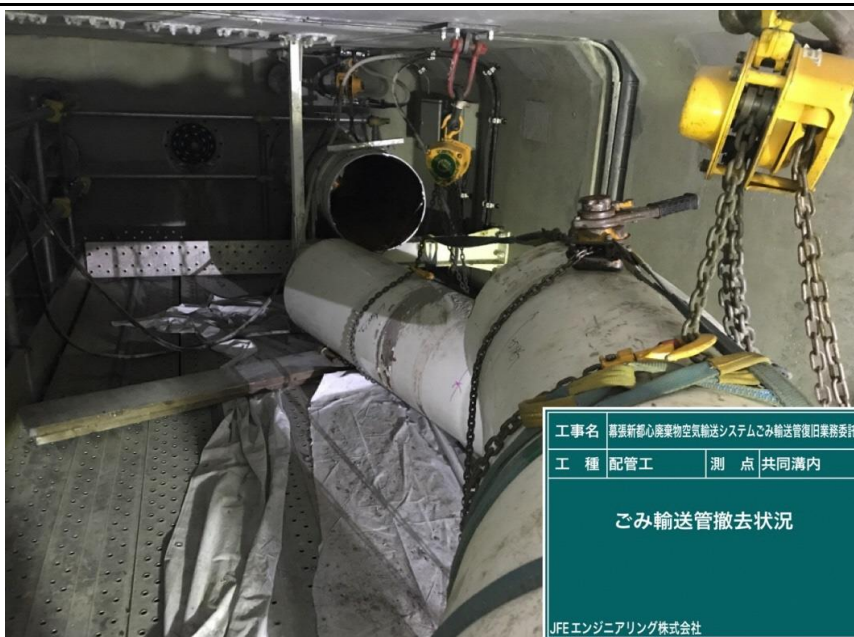

撮影項目 9  
 令和4年3月度  
 履行報告  
 配管工  
 現地工事  
 共同溝内足場組  
 足場組立状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

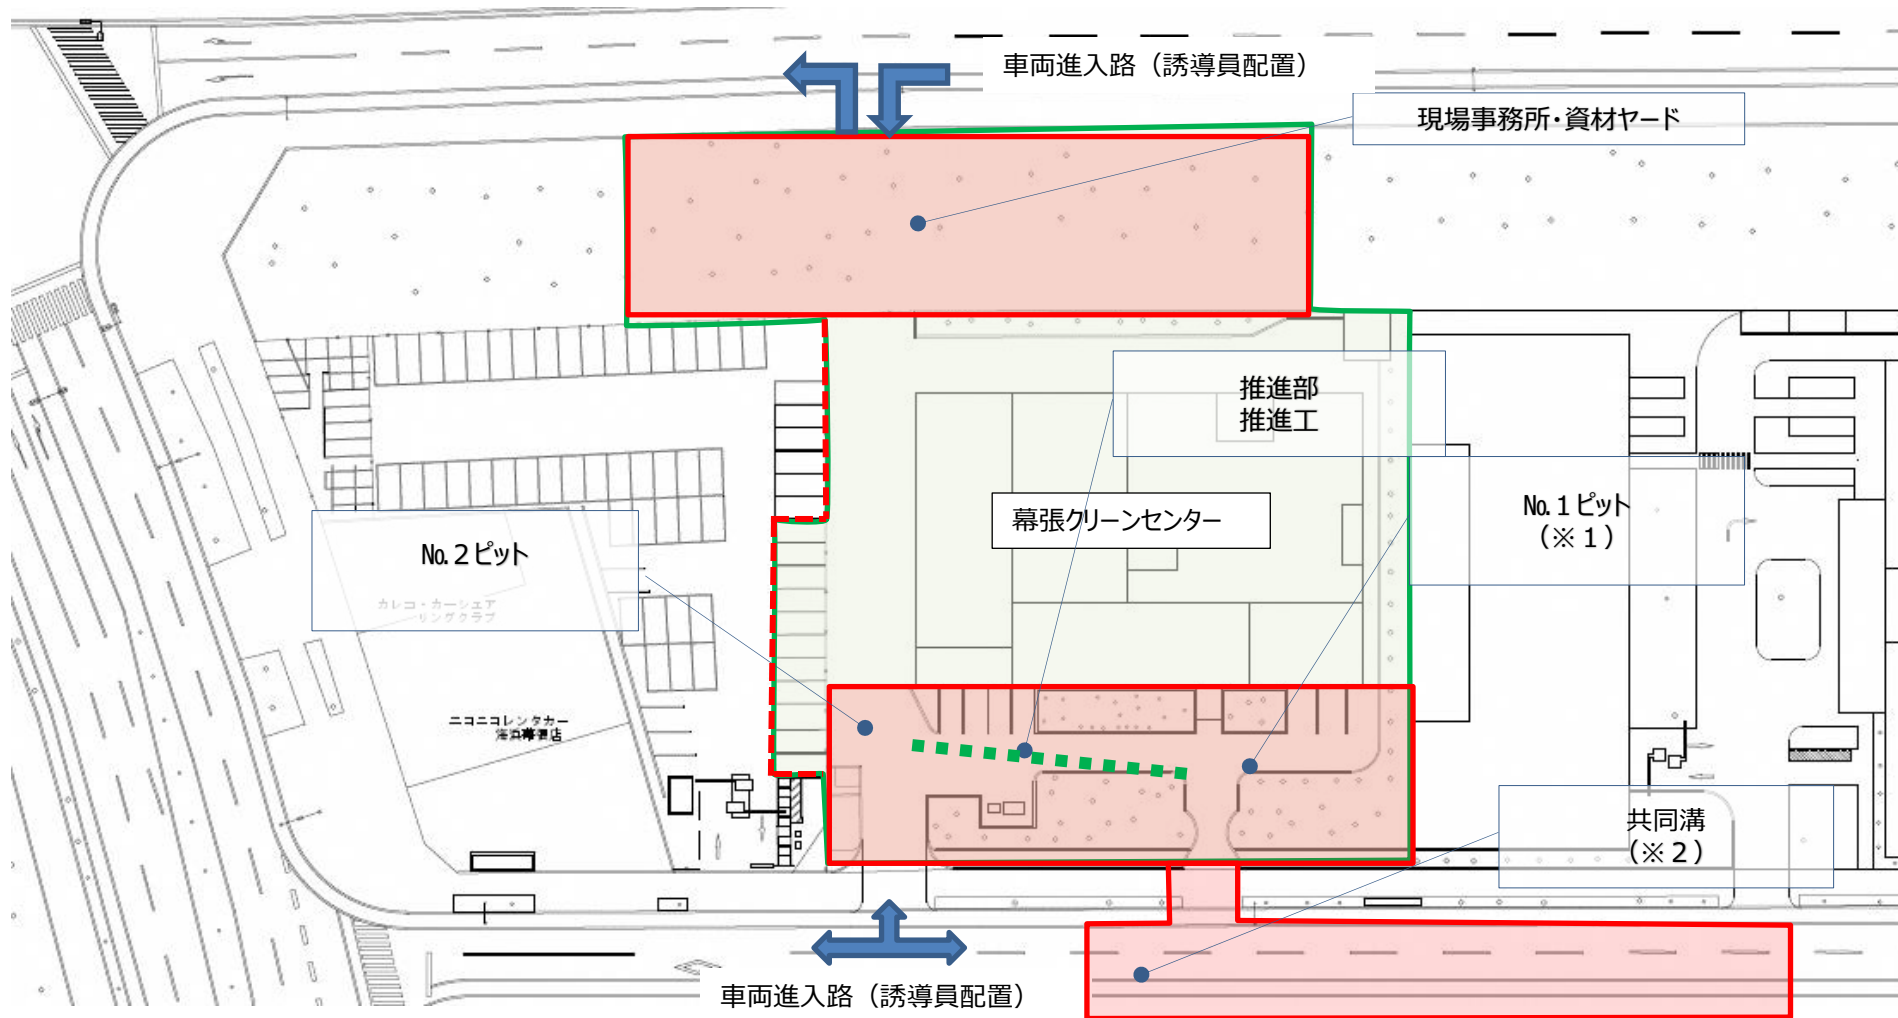

工 事 概 要 図
