

令和4年5月10日  
千葉県環境局資源循環部  
廃棄物施設維持課

## 令和4年4月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年4月の進捗状況及び令和4年5月の作業予定について報告します。

### 1 令和4年4月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（4月実績）は別紙のとおりです。

#### (1) 掘削工（立坑構築工）

- ・No.1ピット (作業状況写真 撮影項目1)
- ・No.2ピット (作業状況写真 撮影項目2～11)

### 2 令和4年5月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（5月予定）は別紙のとおりです。

#### (1) 掘削工（立坑構築工）

- ・No.1ピット

#### (2) 躯体工（推進工）

- ・機材搬入準備
- ・推進工

#### (3) 配管工

- ・既設管搬出
- ・新設配管設置

以 上

# 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表 (4月実績・5月予定)

実線：完了、点線：予定

		2022年																														備考																														
		4月実績															5月予定																																													
No.	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火														
マイルストーン																																																														
1	掘削工 (立坑構築工)																																																													
	NO1ビット (※1)																																																													
	掘削工																																																													
	共同溝つま壁撤去・復旧																																																													
	止水対策工																																																													
	空伏せ工																																																													
	NO2ビット (※2)																																																													
	掘削工																																																													
	土留め支保工																																																													
	空伏せ工																																																													
2	躯体工 (推進工)																																																													
	機材搬入・準備工																																																													
	推進工																																																													
	資機材撤去																																																													
3	配管工																																																													
	新設配管製作																																																													
	新設配管製作																																																													
	新設配管塗装																																																													
	現地工事																																																													
	共同溝内足場組																																																													
	既設配管撤去・搬出																																																													
	新設配管設置																																																													
	足場一部撤去																																																													
4	試験立会関係																																																													
	工事立会																																																													
	材料立会																																																													
5	安全関係																																																													
	安全大会																																																													
	災害防止協議会																																																													

検査、捨てコン

撤去

つま壁復旧

床付検査

捨てコン

掘進機投入

発進線切り

管搬入

撤去用足場組

既設管搬出

令和4年4月度

令和4年4月度

令和4年5月度


令和4年5月度



撮影項目 1  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.1ピット  
 施工状況  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 2  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 土留め支保工  
 1段梁設置状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

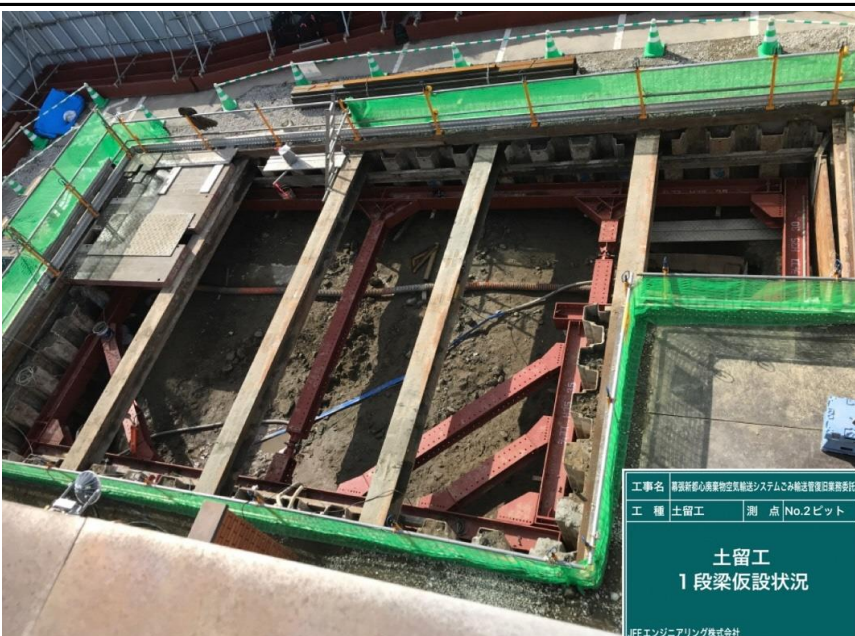

撮影項目 3  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 土留め支保工  
 1段梁設置状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)



撮影項目 4  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 2次掘削状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

工事名 横浜新都市商業物流空輸システムごみ輸送管貫通対策委員会  
 工種 掘削工 測点 No.2ピット  
 掘削工  
 2次掘削状況  
 JFEエンジニアリング株式会社



撮影項目 5  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 既設管防護コンクリート取壊し状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

工事名 横浜新都市商業物流空輸システムごみ輸送管貫通対策委員会  
 工種 既設管撤去工 測点 No.2ピット  
 ごみ輸送管撤去  
 防護コンクリート取壊し  
 JFEエンジニアリング株式会社



撮影項目 6  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 既設管撤去状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

工事名 横浜新都市商業物流空輸システムごみ輸送管貫通対策委員会  
 工種 既設管撤去工 測点 No.2ピット  
 ごみ輸送管撤去  
 撤去状況  
 JFEエンジニアリング株式会社



撮影項目 7  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 床付状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)



撮影項目 8  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 床付状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)



撮影項目 9  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 床付状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)




工事名	専強新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務委託		
工種	施工状況写真	測点	No.2ピット
No2ピット 均しコンクリート打設状況			
JFEエンジニアリング			

撮影項目 10  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 均しコンクリート打設状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)



工事名	専強新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務委託		
工種	施工状況写真	測点	No.2ピット
No2ピット 均しコンクリート打設完了			
JFEエンジニアリング			

撮影項目 11  
 令和4年4月度  
 履行報告  
 掘削工(立坑構築工)  
 No.2ピット  
 掘削工  
 均しコンクリート打設状況  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)

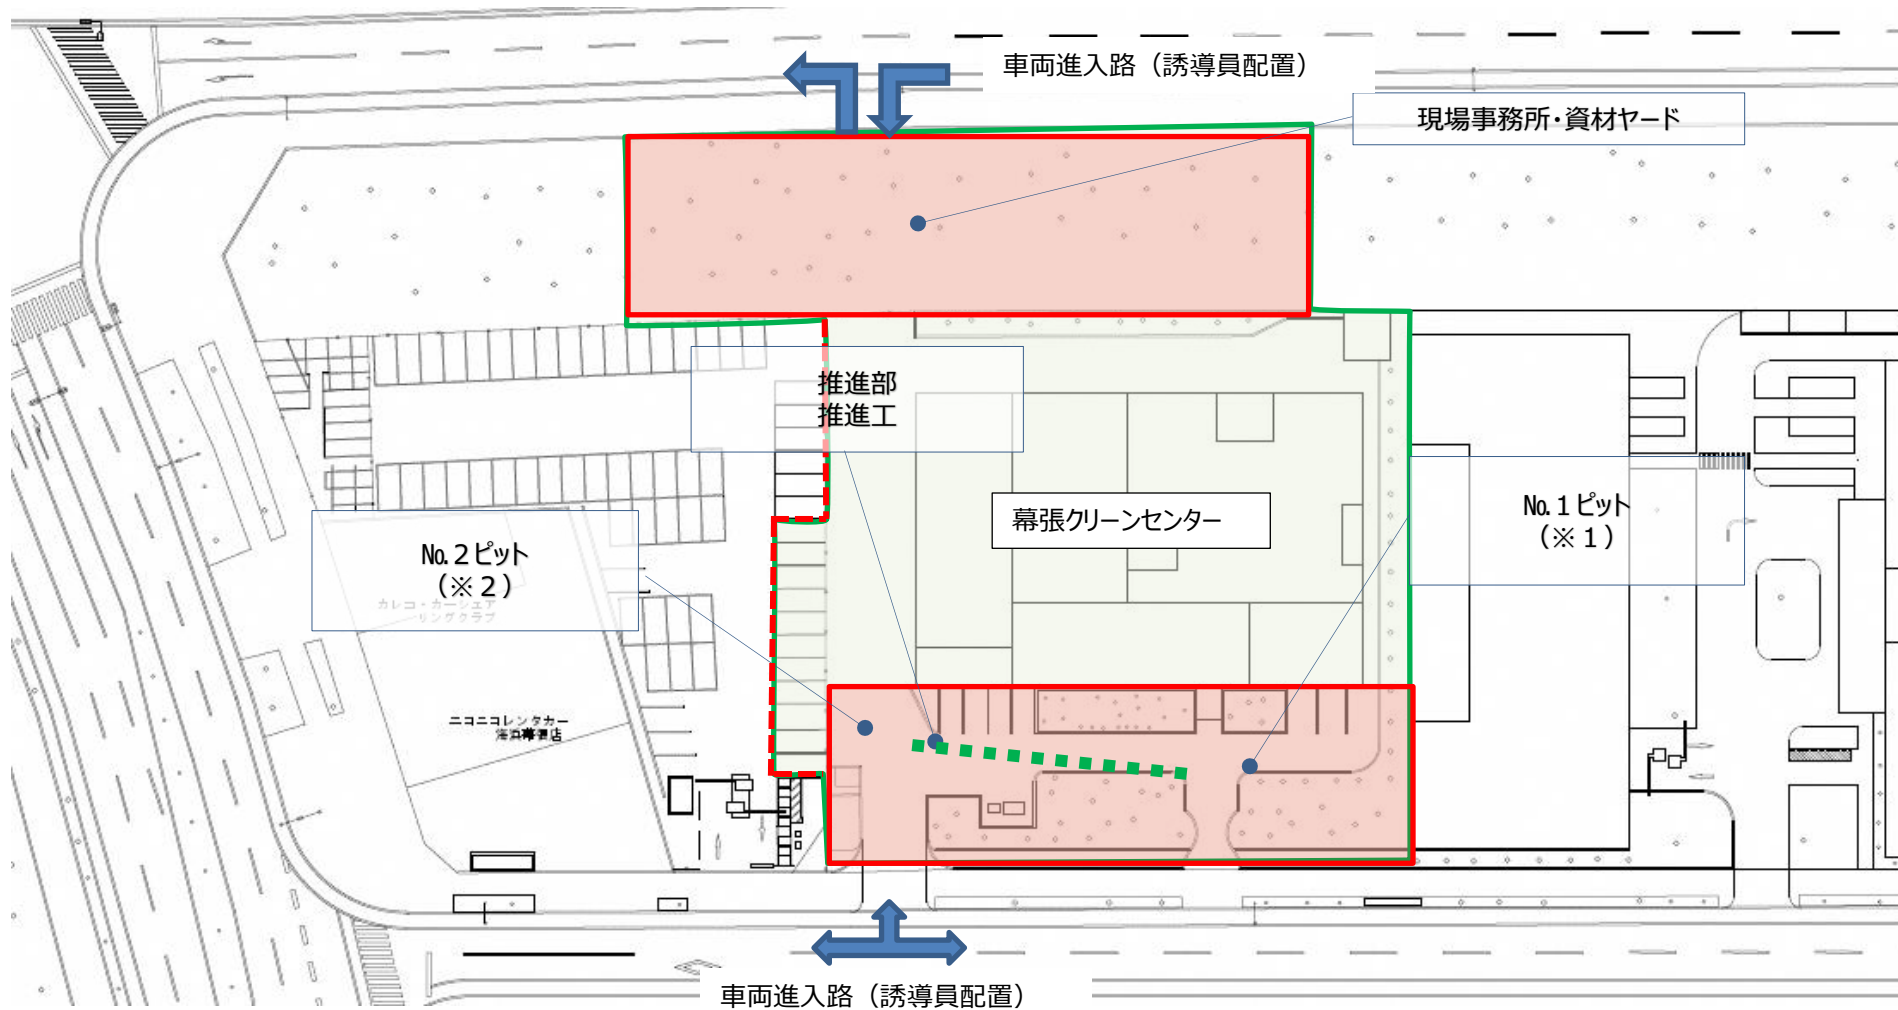

工 事 概 要 図
