

令和4年6月14日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和4年5月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年5月の進捗状況及び令和4年6月の作業予定について報告します。

1 令和4年5月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（5月実績）は別紙のとおりです。

(1) 掘削工（立坑構築工）

・No.1ピット (作業状況写真 撮影項目1～4、7～8)

(2) 推進工

・機材搬入、準備工 (作業状況写真 撮影項目5～6)

2 令和4年6月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（6月予定）は別紙のとおりです。

(1) 掘削工（立坑構築工）

・No.1ピット

(2) 推進工

・機材搬入準備

・推進工

(3) 配管工

・既設配管搬出

・新設配管設置

(4) 躯体工

・No.1ピット

・No.2ピット

・ボックストンネル

以 上




撮影項目 1
 令和4年5月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 置き換えコンクリート
 均しコンクリート
 打設状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 2
 令和4年5月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 置き換えコンクリート
 均しコンクリート
 打設完了
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 3
 令和4年5月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 止水対策工
 薬液注入状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)

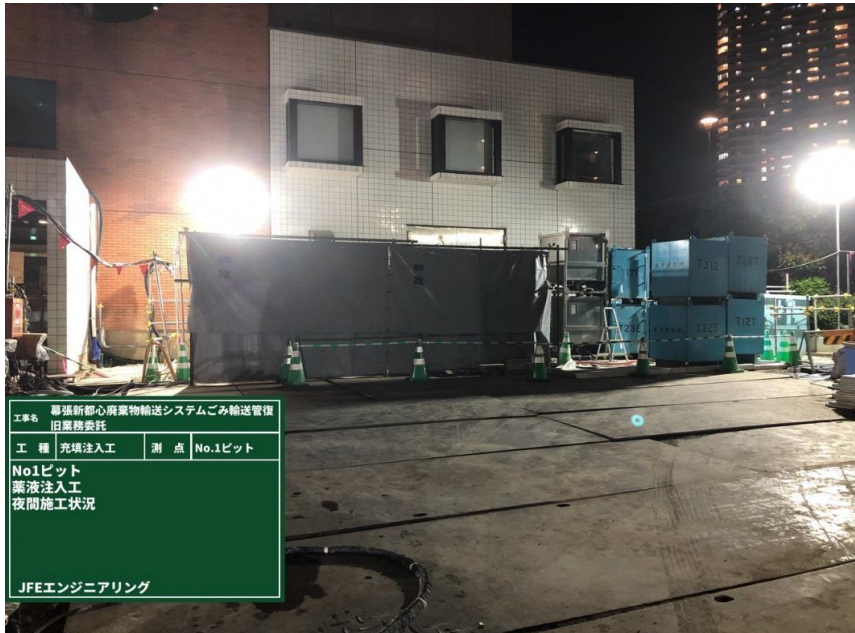

工事名 幕張新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務委託
 工種 充填注入工 測点 No.1ピット
 No.1ピット
 薬液注入工
 夜間施工状況
 JFEエンジニアリング

撮影項目 4
 令和4年5月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 止水対策工
 防音措置状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名 幕張新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務委託
 工種 推進工 測点 No.1ピット
 支圧壁型枠
 コンクリート打設状況
 JFEエンジニアリング株式会社

撮影項目 5
 令和4年5月度
 履行報告
 躯体工(推進工)
 機材搬入・準備工
 支圧壁型枠
 コンクリート打設
 (工事概略図※1)
 (工程表※2)



工事名 幕張新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務委託
 工種 推進工 測点 No.1ピット
 発進架台設置
 JFEエンジニアリング株式会社


撮影項目 6
 令和4年5月度
 履行報告
 躯体工(推進工)
 機材搬入・準備工
 発進架台設置状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※2)



撮影項目 7
 令和4年5月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 共同溝つま壁撤去工
 撤去前全景
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 8
 令和4年5月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 共同溝つま壁撤去工
 コア削孔状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)

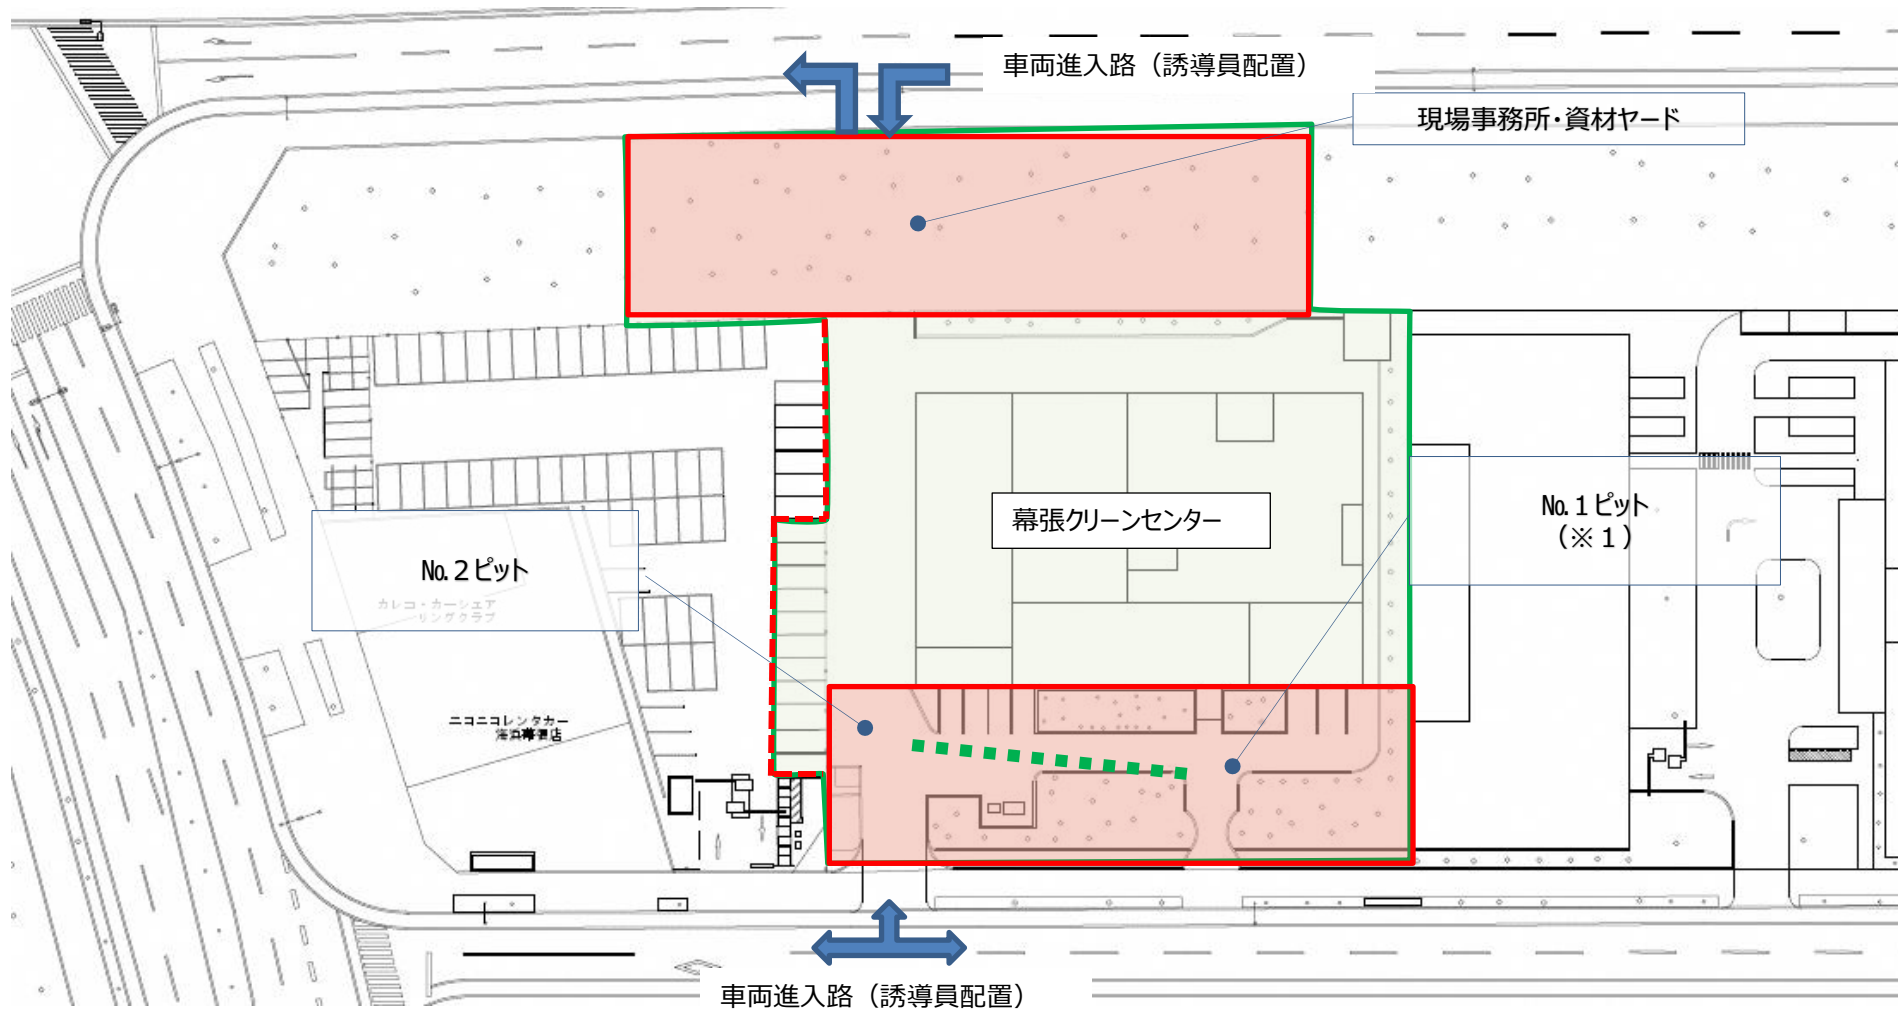

工 事 概 要 図
