

令和4年12月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年12月の進捗状況及び令和5年1月の作業予定について報告します。

1 令和4年12月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（12月実績）は別紙のとおりです。

(1) 躯体工

- ・No.1 ピット (作業状況写真 撮影項目1～2)
- ・南側歩道部 (作業状況写真 撮影項目3～4)

(2) 外構復旧関係

- ・駐車場舗装他 (作業状況写真 撮影項目5)

(3) 電工

- ・No.1 ピット (作業状況写真 撮影項目6、9～10)
- ・推進管部 (作業状況写真 撮影項目7)
- ・No.2 ピット (作業状況写真 撮影項目8、11～12)


2 令和5年1月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（令5年1月予定）は別紙のとおりです。

(1) 外構復旧関係

(2) 電工

以 上

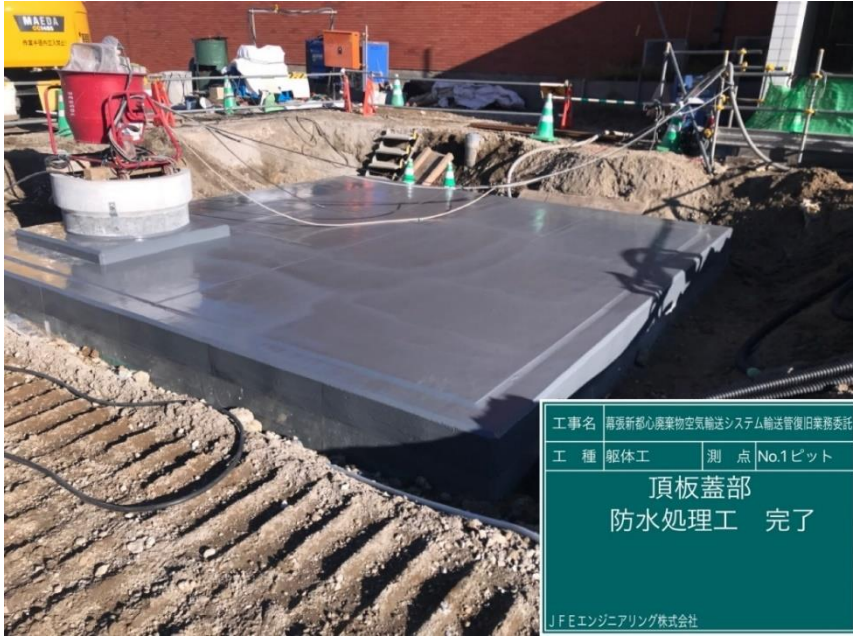

撮影項目 1
 令和4年12月度
 履行報告
 躯体工
 No.1ピット
 防水工
 防水処理状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 2
 令和4年12月度
 履行報告
 躯体工
 No.1ピット
 防水工
 防水保護コン状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 3
 令和4年12月度
 履行報告
 躯体工
 No.1ピット
 覆工板撤去工
 覆工受桁撤去状況
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)



撮影項目 4
 令和4年12月度
 履行報告
 躯体工
 No.1ピット
 覆工板撤去工
 覆工受桁撤去完了状況
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)



撮影項目 5
 令和4年12月度
 履行報告
 外構復旧関係
 駐車場舗装他
 駐車場舗装復旧状況
 (工事概略図※3)
 (工程表※2)



撮影項目 6
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 照明関係
 No.1ピット
 照明設置状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※3)



撮影項目 7
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 照明関係
 推進管内
 照明設置状況
 (工事概略図※4)
 (工程表※3)



撮影項目 8
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 照明関係
 No.2ピット
 照明設置状況
 (工事概略図※5)
 (工程表※3)



撮影項目 9
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 排水ピット動力
 No.1ピット
 ポンプ設置状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※3)




撮影項目 10
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 排水ピット動力
 No.1ピット
 流量計設置状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※3)



撮影項目 11
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 排水ピット動力
 No.2ピット
 ポンプ設置状況
 (工事概略図※5)
 (工程表※3)



撮影項目 12
 令和4年12月度
 履行報告
 電気
 排水ピット動力
 No.2ピット
 流量計設置状況
 (工事概略図※5)
 (工程表※3)

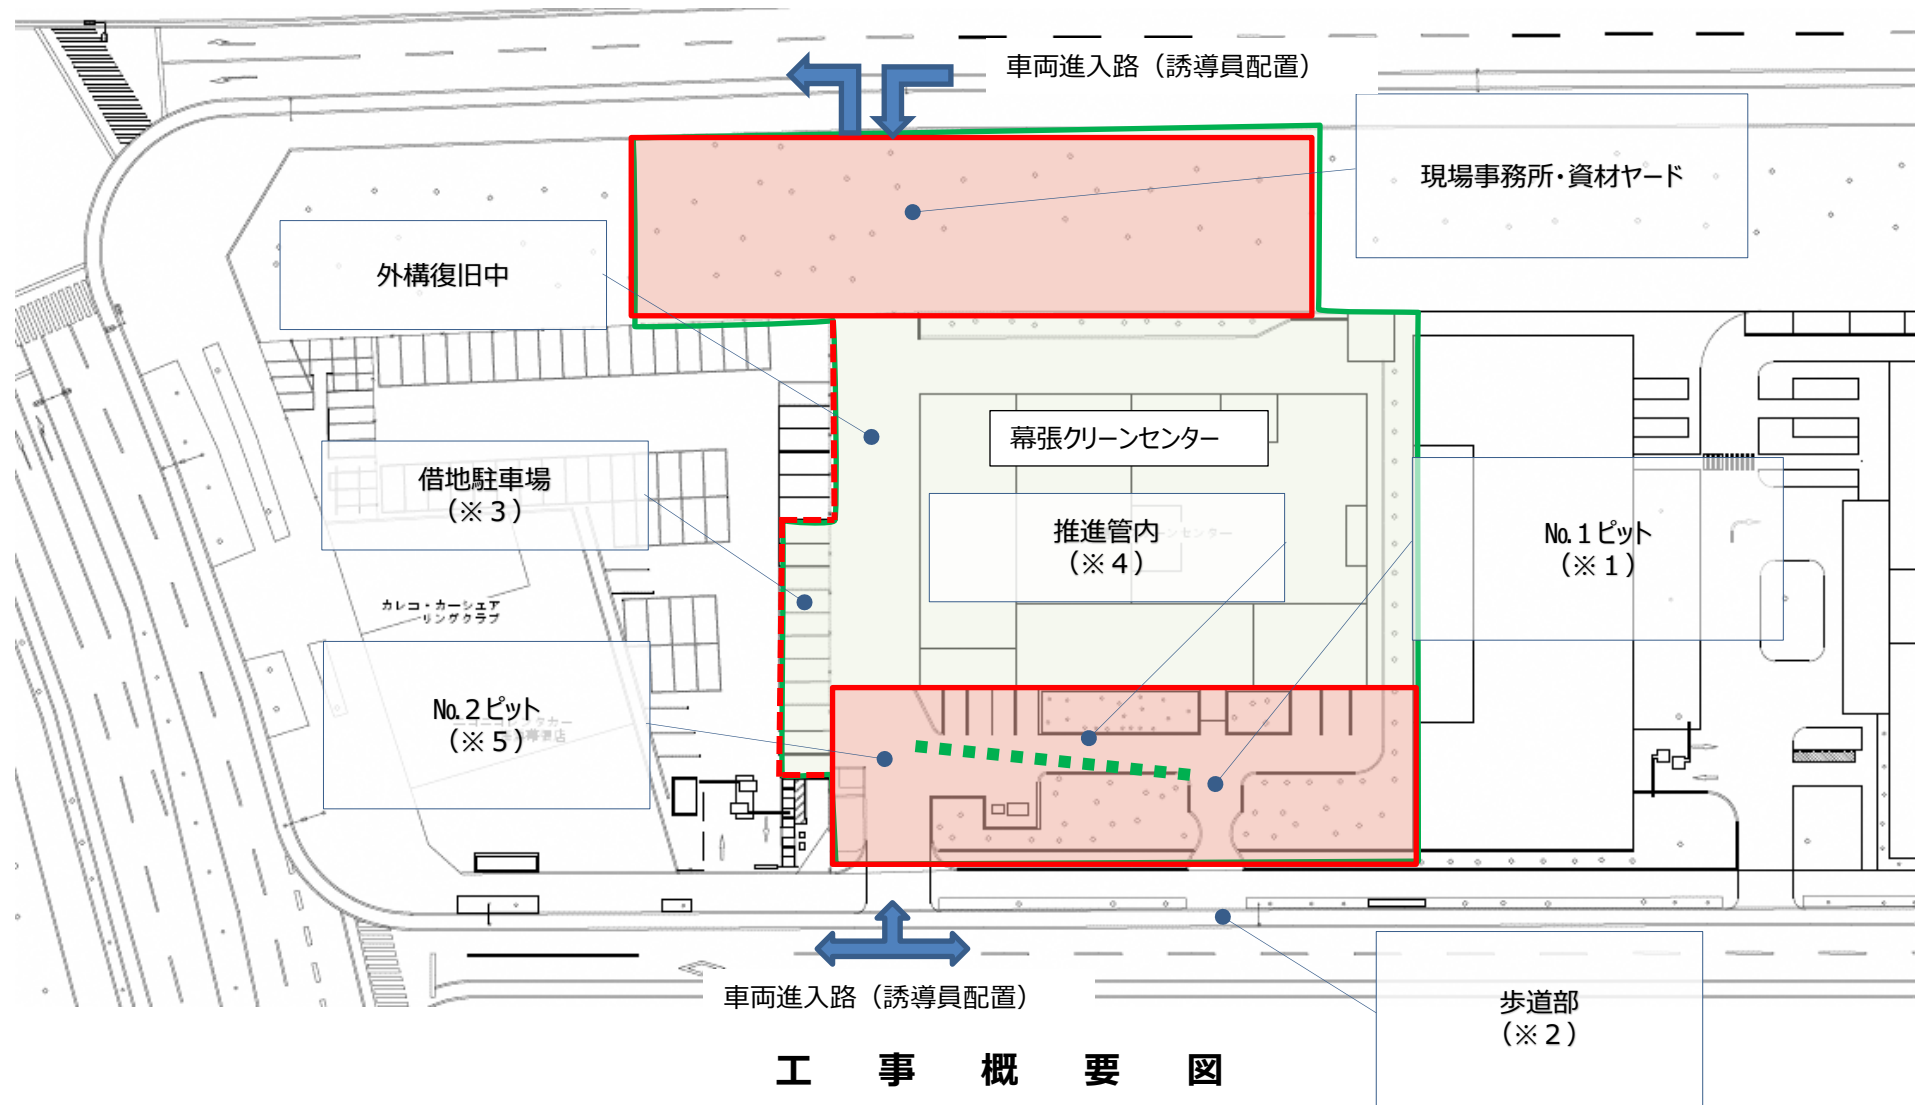

工 事 概 要 図
