

令和5年2月3日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和5年1月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和5年1月の進捗状況及び令和5年2月の作業予定について報告します。

1 令和5年1月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（1月実績）は別紙のとおりです。

(1) 外構復旧関係

- ・車両乗入れ部復旧 (作業状況写真 撮影項目 1～3)
- ・ゲート設置 (作業状況写真 撮影項目 4～6)

2 令和5年2月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（令5年2月予定）は別紙のとおりです。

- (1) 外構復旧関係
- (2) 電気
- (3) 付帯工・清掃

以 上



撮影項目 1
 令和5年1月度
 履行報告
 外構復旧関係
 舗装工
 車両乗入れ部転圧状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 2
 令和5年1月度
 履行報告
 外構復旧関係
 舗装工
 車両乗入れ部
 コンクリート打設状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 3
 令和5年1月度
 履行報告
 外構復旧関係
 舗装工
 車両乗入れ部
 仮復旧完了
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 4
 令和5年1月度
 履行報告
 外構復旧関係
 ゲート設備設置
 基礎鉄筋、型枠組立状況

(工事概略図※2)
 (工程表※1)




撮影項目 5
 令和5年1月度
 履行報告
 外構復旧関係
 ゲート設備設置
 基礎コンクリート打設状況

(工事概略図※2)
 (工程表※1)



撮影項目 6
 令和5年1月度
 履行報告
 外構復旧関係
 ゲート設備設置
 基礎コンクリート打設完了

(工事概略図※2)
 (工程表※1)

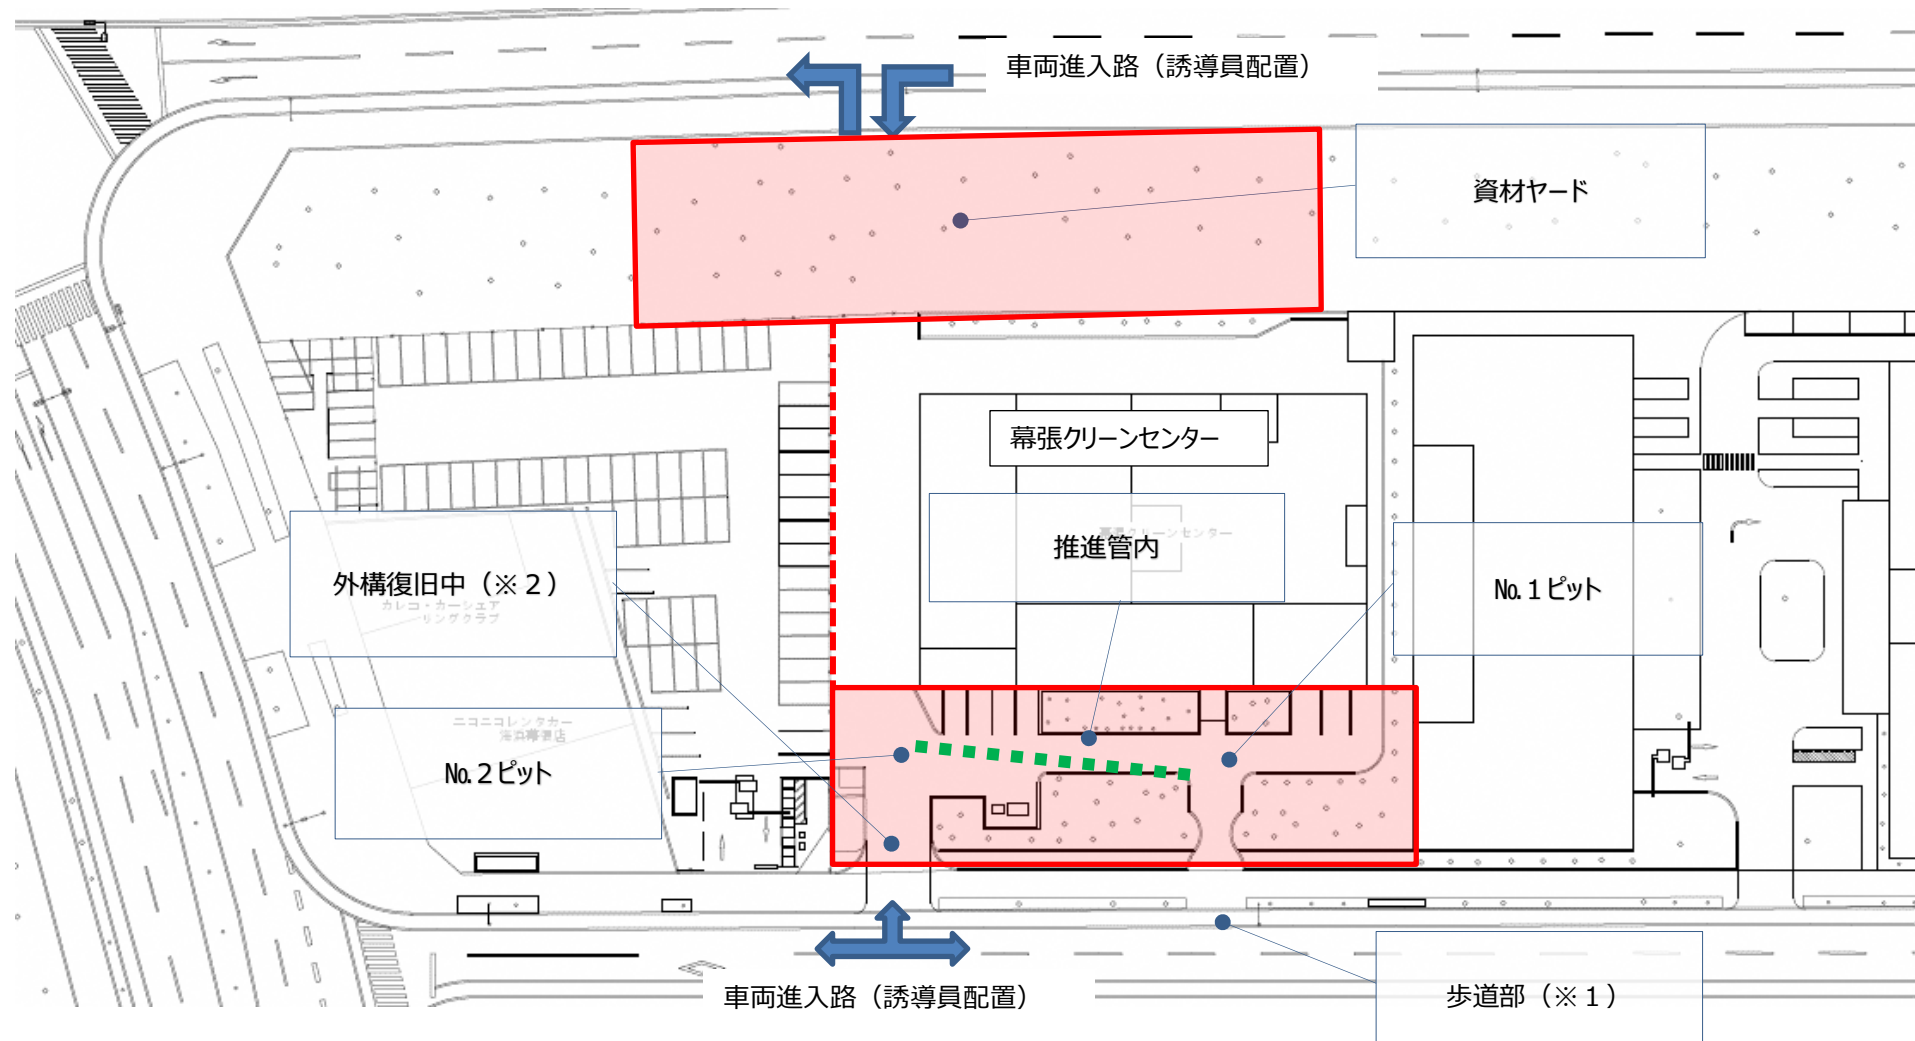

工 事 概 要 図
