

令和5年3月22日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和5年3月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託は令和5年3月18日をもって完了いたしましたので報告いたします。

1 令和5年3月の進捗状況

以下のとおり作業を実施しました。工程表（3月実績）は別紙のとおりです。

（1）外構復旧関係

・ゲート設備設置 （作業状況写真 撮影項目1～2）

以 上



工事名	幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	外構工	測点	東側
出入口ゲート設置状況			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 1
 履行報告
 外構復旧関係
 ゲート設備設置
 東側ゲート設置完了状況

(工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名	幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	外構工	測点	西側
出入口ゲート設置状況			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 2
 履行報告
 外構復旧関係
 ゲート設備設置
 西側ゲート設置完了状況

(工事概略図※2)
 (工程表※1)



工事名	幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	着手前、完成	測点	歩道部
工事完成			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 6
 履行報告
 工事完了状況
 幕張クリーンセンター
 南側歩道

(工事概略図※3)



撮影項目 4

履行報告

工事完了状況

幕張クリーンセンター
北側緑地

(工事概略図※4)



撮影項目 5

履行報告

工事完了状況

幕張クリーンセンター外観1



撮影項目 6

履行報告

工事完了状況

幕張クリーンセンター外観2



工事名	再張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	着手前、完成	測点	クリーンセンター
工事完成			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 7

履行報告


工事完了状況

幕張クリーンセンター外観3

幕張新都心廃棄物空気輸送システム ごみ輸送管復旧業務委託 工程表 (3月実績)

実線：完了、点線：予定

項目		3月予定																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
No.		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
	マイルストーン																		▼	しゅん工													
1	外構復旧関係 (※1)																																
	ゲート設備設置			■																													
2	事務所閉鎖																																
	作業員詰所撤去			■																													
	事務所備品撤去																■																

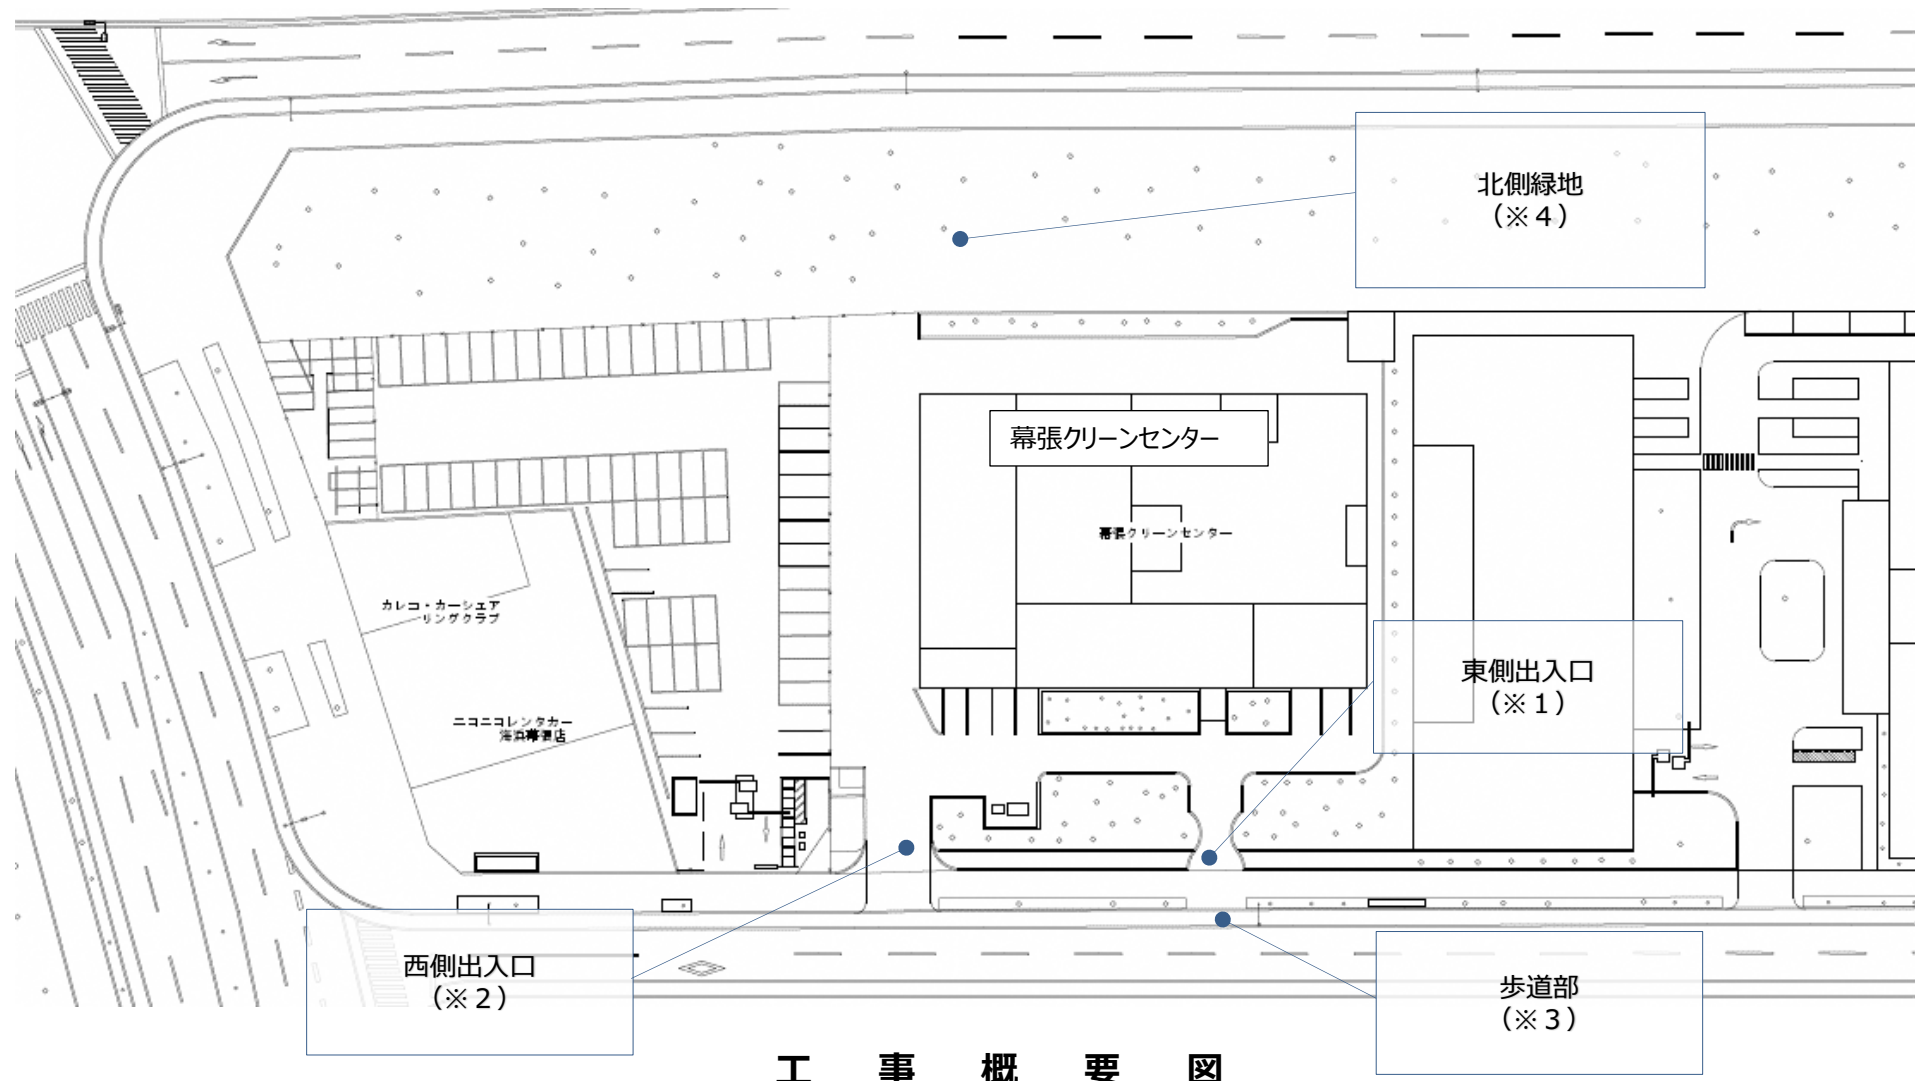

工 事 概 要 図
