


平成26年4月の統合に向けた話し合いのスケジュール

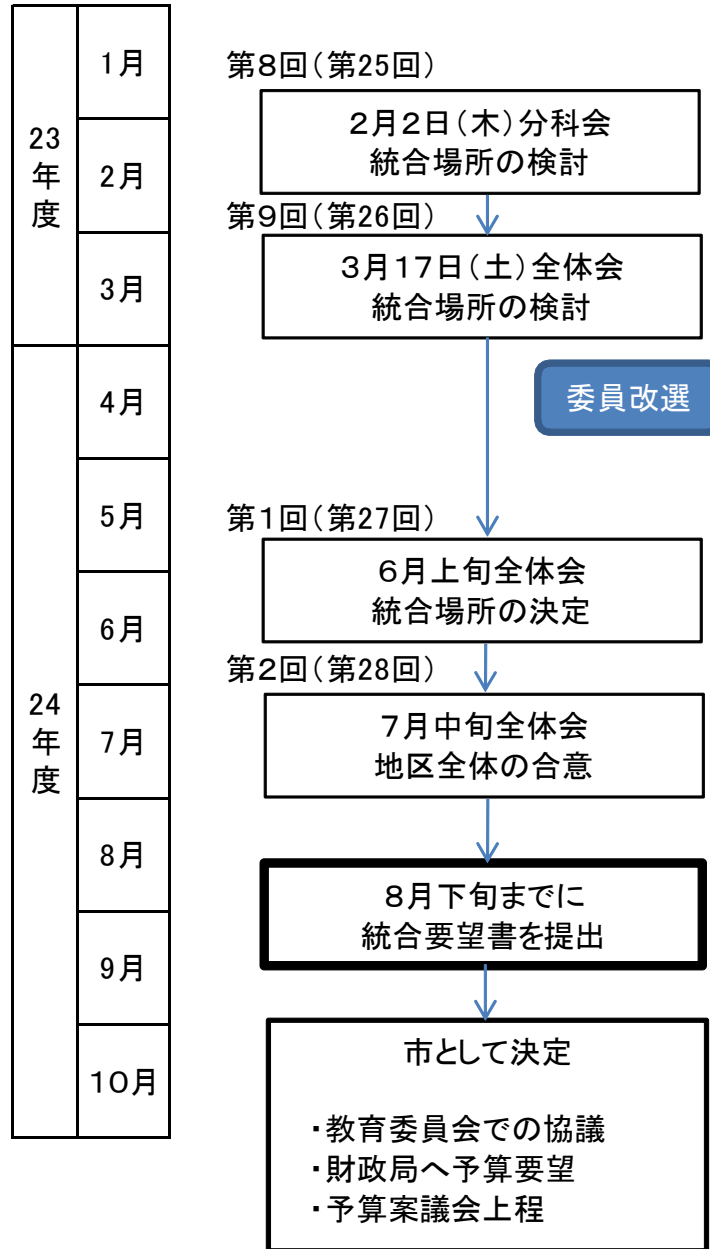

平成26年4月の統合に向けたシミュレーション

<第二段階の統合>

※本資料は、あくまでも現段階で想定されるシミュレーションである。

1 統合場所：幸町一小（引越3回）

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|------|--------|-----------------------|---------------------|--------|-------------|
| 幸町二小 | 通常使用 | 通常使用 | 統合② 統合校の仮校舎として使用 | | 跡施設 |
| 幸町一小 | 通常使用 | 統合① 通常使用 (設計期間) | 業者選定及び契約までの準備期間 | 改修工事 | 統合校の校舎として使用 |
| 幸町四小 | 通常使用 | | | | 跡施設 |

2 統合場所：幸町二小（引越2回）

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|------|--------|-------------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 幸町二小 | 通常使用 | 通常使用 (設計・修繕期間) | 業者選定及び契約までの準備期間 改修工事 (居ながら施工) | | 統合校の校舎として使用 |
| 幸町一小 | 通常使用 | 統合① 通常使用 | | | 跡施設 |
| 幸町四小 | 通常使用 | | | | 跡施設 |

3 統合場所：幸町四小

ア 幸町二小を仮校舎とする案（3校統合年度26年度・引越3回）

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 年度未定 |
|------|--------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 幸町二小 | 通常使用 | 通常使用 | 統合② 統合校の仮校舎として使用 | 跡施設 |
| 幸町一小 | 通常使用 | 統合① 通常使用 | 跡 | 施設 |
| 幸町四小 | 通常使用 | URとの協議 | | 業者選定及び契約までの準備期間 改修工事 移転③ |

イ 仮校舎を設定しない案（3校統合年度未定・引越2回）

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 年度未定 |
|------|--------|-------------|--------|--------------------------------|
| 幸町二小 | 通常使用 | 通常使用 | 通常使用 | 跡施設 |
| 幸町一小 | 通常使用 | 統合① 通常使用 | 通常使用 | 跡施設 |
| 幸町四小 | 通常使用 | URとの協議 | | 業者選定及び契約までの準備期間 改修工事 統合② |

* 幸町四小にプレハブ校舎を建てる等の増築については、URとの協議や用地取得などが必要なため、実現可能性が現時点では不明であり、移転（又は統合）時期は未定である。
