

令和4年3月15日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和4年2月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年2月の進捗状況及び令和4年3月の作業予定について報告します。

1 2月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（2月実績）は別紙のとおりです。

- (1) 地盤改良工
 - ・ 推進部 (作業状況写真 撮影項目1)
 - ・ No.2 ピット (作業状況写真 撮影項目2～4)
- (2) 掘削工（立坑構築工）
 - ・ No.1 ピット (作業状況写真 撮影項目5～8)

2 3月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（3月予定）は別紙のとおりです。

- (1) 掘削工（立坑構築工）
 - ・ No.1 ピット
 - ・ No.2 ピット
- (2) 躯体工（推進工）
 - ・ 機材搬入準備、推進工
- (3) 配管工
 - ・ 既設配管撤去搬出

以 上

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表 (2月実績・3月予定)

実線：完了、点線：予定

No	項目	2022年																															備考																									
		2月実績															3月予定																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木												
1	ヤード造成工 (クリーンセンター・歩道部)																																																									
	ヤード内整備工																																																									
2	地盤改良工																																																									
	推進部 (※1)																																																									
	No2ピット (※2)																																																									
	事後ホーリング他																																																									
3	掘削工 (立坑構築工)																																																									
	NO1ピット (※3)																																																									
	ディーブエール工 (立坑)																																																									
	掘削工 (立坑・連絡ホックス)																																																									
	土留め支保工 (立坑)																																																									
	共同溝つま整撤去																																																									
	NO2ピット																																																									
	掘削工																																																									
	土留め支保工																																																									
4	躯体工 (推進工)																																																									
	機材搬入・準備工																																																									
	推進工																																																									
5	配管工																																																									
	新設配管製作																																																									
	新設配管製作																																																									
	新設配管塗装																																																									
	現地工事																																																									
	共同溝内足場設置																																																									
	既設配管撤去・搬出																																																									
	新設配管設置																																																									
6	現場周辺環境改善・付帯工																																																									
	足場材搬入																																																									
7	試験立会関係																																																									
	工事立会																																																									
	材料立会																																																									
8	安全関係																																																									
	安全大会																																																									
	災害防止協議会																																																									

令和4年2月度

【作業状況写真】



撮影項目 1
 令和4年2月度
 履行報告
 地盤改良工
 推進部
 施工状況
 (工事概要図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 2
 令和4年2月度
 履行報告
 地盤改良工
 No.2ピット
 施工全景
 (工事概要図※2)
 (工程表※2)



撮影項目 3
 令和4年2月度
 履行報告
 地盤改良工
 No.2ピット
 施工状況
 (工事概要図※2)
 (工程表※2)



工事名	横浜新都市商業地空輸送システムこみ輸送管理旧業務委託	
工種	地盤改良工	測点
地盤改良工 プラント解体状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 4
 令和4年2月度
 履行報告
 地盤改良工
 No.2ピット
 プラント解体状況
 (工事概要図※3)
 (工程表※2)



撮影項目 5
 令和4年2月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 施工全景
 (工事概要図※4)
 (工程表※3)



工事名	横浜新都市商業地空輸送システムこみ輸送管理旧業務委託	
工種	掘削工	測点 No.1ピット
二次掘削工 掘削状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 6
 令和4年2月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 施工状況
 (工事概要図※4)
 (工程表※3)




工事名	藤原新駅心臓部物空架設システムこみ輸送管架設工事	
工種	掘削工	測点 No.1ピット
二次掘削工 掘削状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 7
 令和4年2月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 地盤改良材 取壊し状況
 (工事概要図※4)
 (工程表※3)



工事名	藤原新駅心臓部物空架設システムこみ輸送管架設工事	
工種	掘削、山留め工	測点 No.1ピット
南側1段腹起し 設置状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 8
 令和4年2月度
 履行報告
 掘削工(立坑構築工)
 No.1ピット
 土留支保工 設置
 (工事概要図※4)
 (工程表※3)

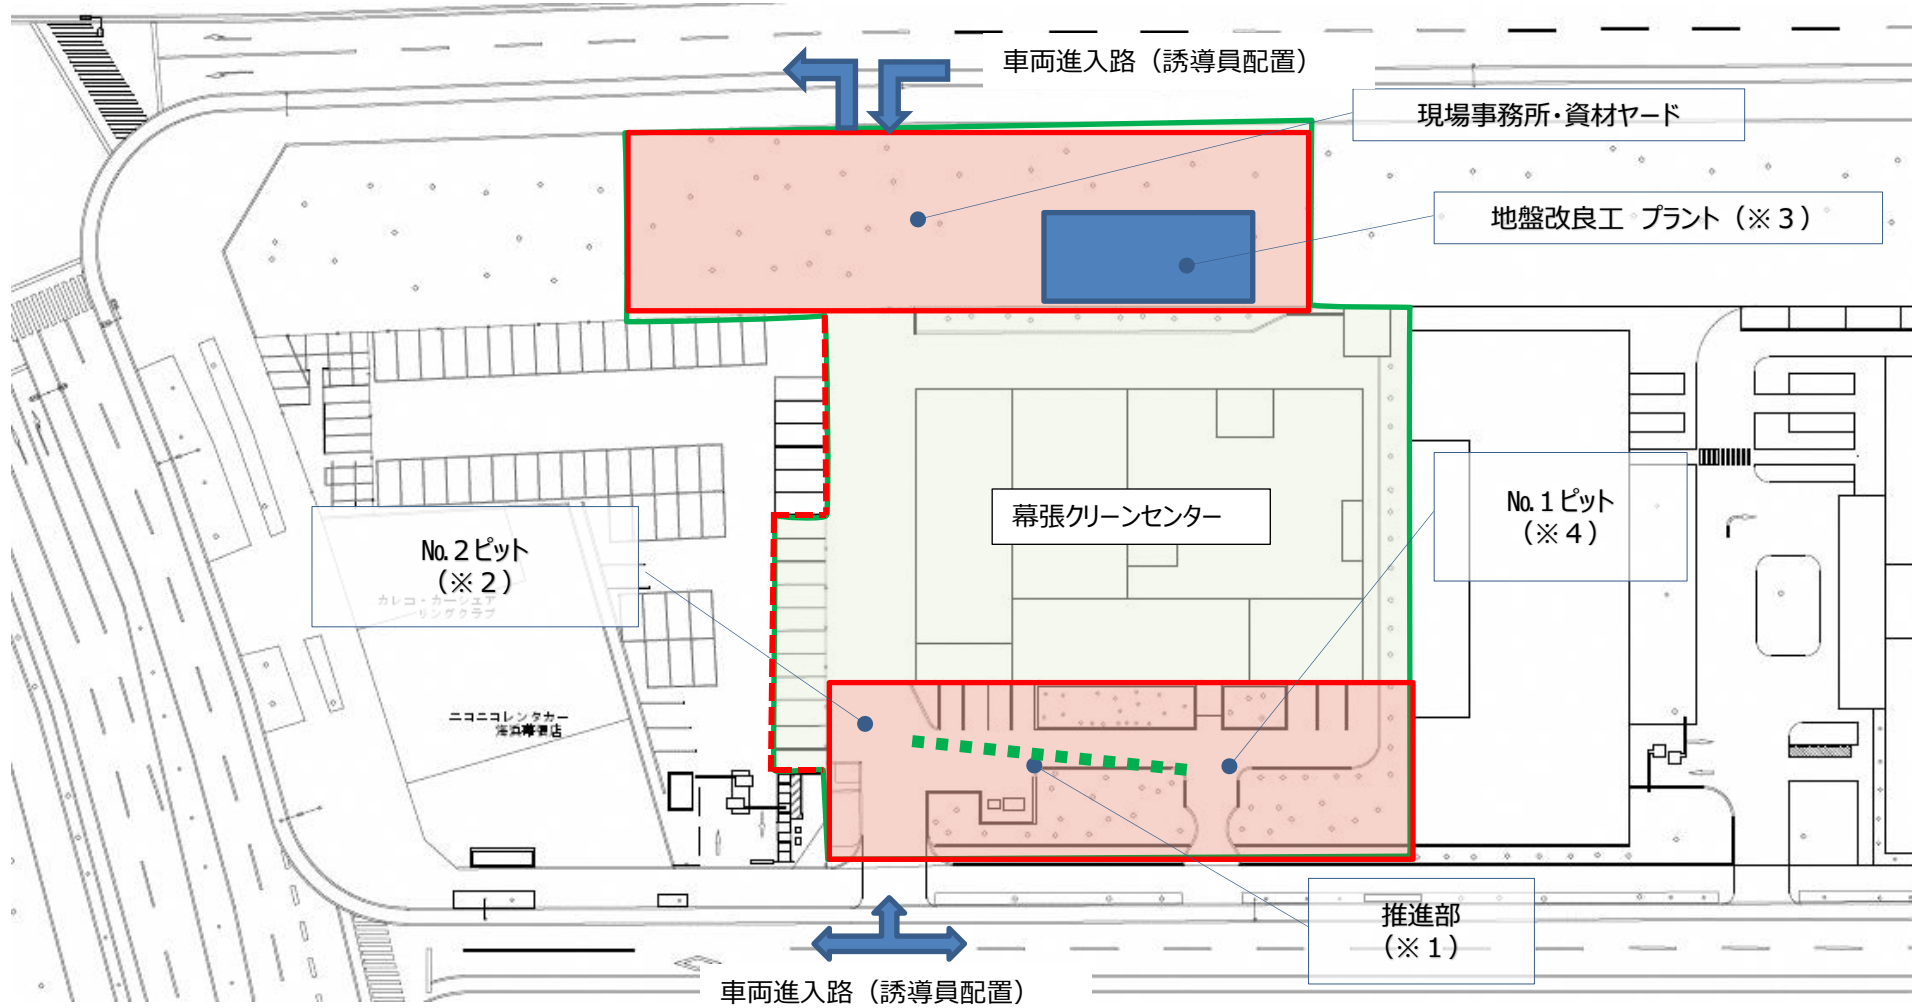

工 事 概 要 図
