年度別事故件数表（平成11年度～令和4年度）

令和5年3月末時点

	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
事故件数（件）	1	0	5	3	6	6	5	6	7	6	3	1	2	0	4	2	3	5	5	6	10	10	14	7	117
うち死亡者数	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	9

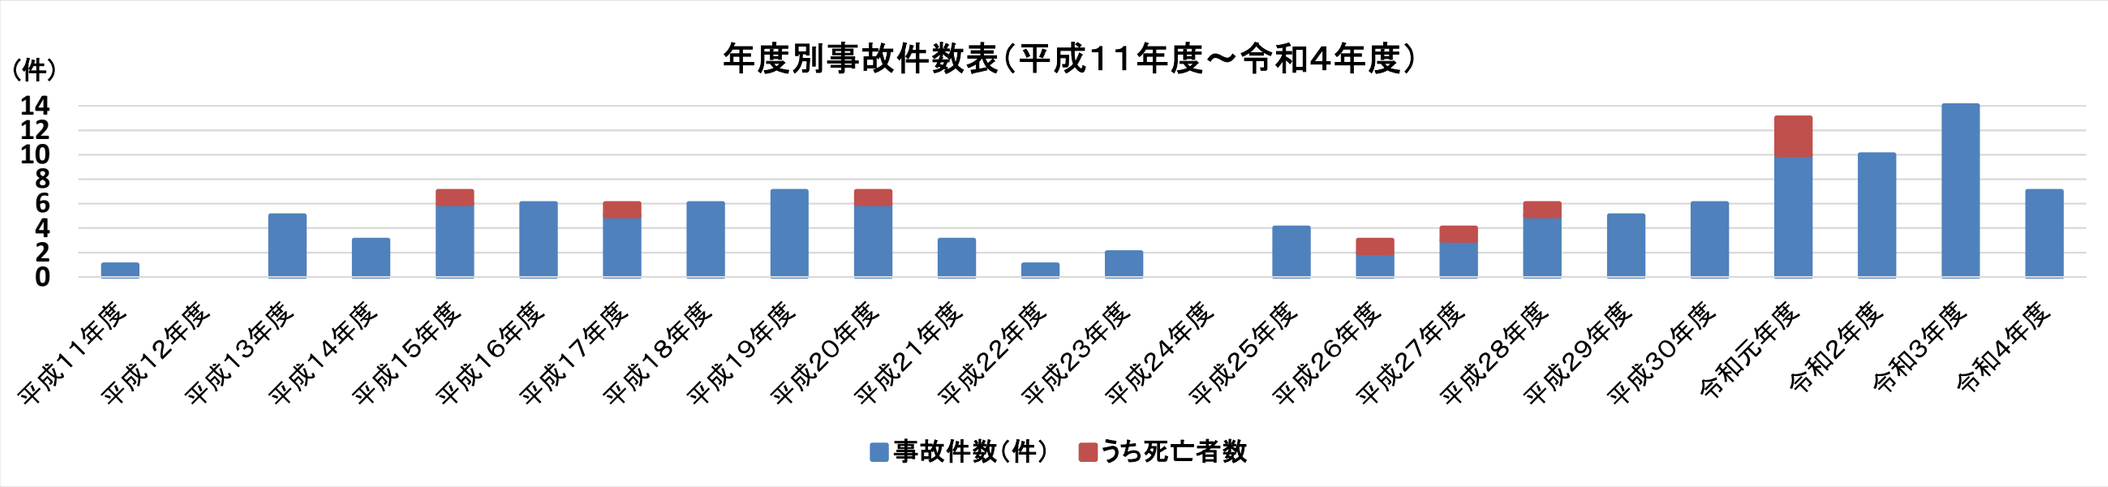

事故形式別事故件数表（平成11年度～令和4年度）

令和5年3月末時点

	墜落・転落	はさまれ巻き込まれ	交通事故	転倒	重機	飛来・落下	崩壊・倒壊	激突	その他	合計
事故件数（件）	33	13	14	7	8	9	3	2	28	117
うち死亡者数	4	1	2	0	1	1	0	0	0	9

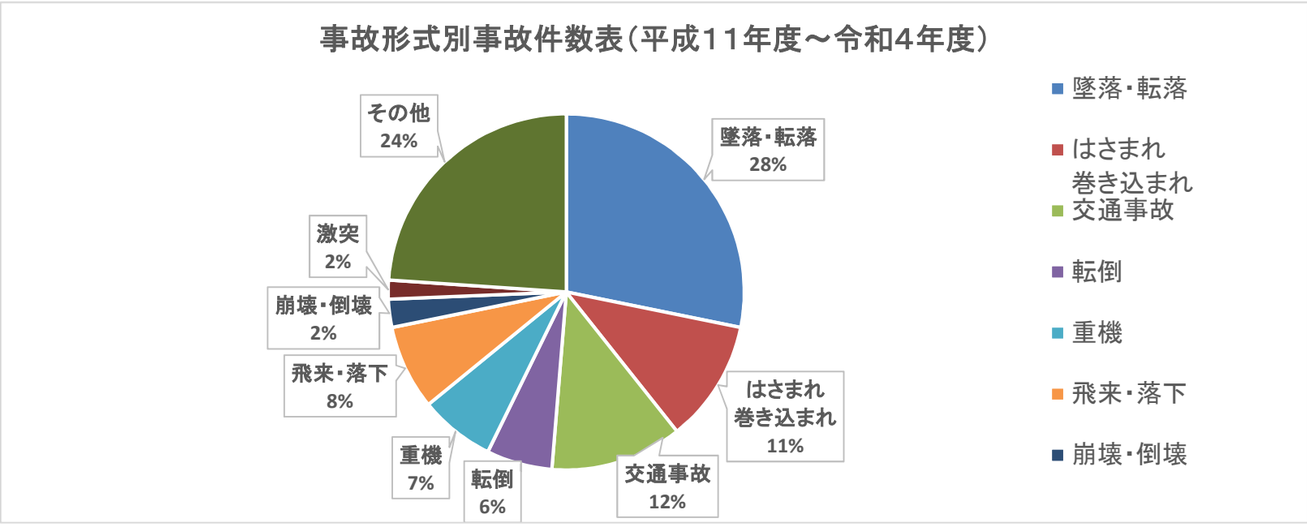

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
H18	1	平成18年 6月21日 21時13分	飛来、落下	土木工事	投光器をトラックから荷卸する作業中に、クレーンとモノレールが接触し、その衝突により切れたクレーン先端のフックが、作業員の右足に衝突し、負傷した。
	2	平成18年 8月10日 9時45分	交通事故	土木工事	排水施設工事完了時の現場清掃作業中、清掃機材を取りに道路横断するところを、現場内に進入してきた乗用車と接触し、負傷した。
	3	平成18年 8月17日 9時30分	墜落・転落	土木工事	カルバート据付時にグラウト注入のために台場に乗り作業を実施していたが、不安定な作業床に乗り、転倒し負傷した。
	4	平成18年 10月28日 10時35分	挟まれ事故	解体工事	解体工事において、廃材袋を重機に固定する作業中、作業員の母指を誤って重機で挟み、負傷させた。
	5	平成19年 1月25日 13時15分	墜落・転落	土木工事	特殊人孔築造に先立ち昇降設備（梯子）をユニックで移動させる時に、昇降設備が山留めに絡まったため、人力にて振り解こうとした際、誤って転落し、負傷した。
	6	平成19年 2月8日 13時40分	崩壊	解体工事	解体用吊り治具を組み立てる際に、その材料として使用する、H鋼をクレーンにて荷卸した時に、荷卸場の台場状況が悪く、荷崩れを起こし、負傷した。
H19	1	平成19年 4月18日 8時25分	激突され	建築工事	定置水平ジブ式クレーンを使用し、鉄筋馬を巻き上げ水平移動したところ、荷崩れを起こし下部で作業を行っていた作業員に当り負傷した。
	2	平成19年 5月22日 15時30分	墜落・転落	土木工事	切梁上で、仮桟橋ブレス材（ブルマン）を締め付け作業中にトルクレンチがボルトから外れ、バランスを崩し切梁下（H=1.2m）に飛び降りた際、左足を捻った。
	3	平成19年 6月2日 2時47分	墜落・転落	土木工事	張出し足場の解体作業中、パネル足場の番線結束部（特殊継手部）に乗った際、足場が崩れ、墜落し負傷した。安全帯は使用していなかった。
	4	平成19年 7月20日 13時15分	公衆災害	下水道工事	重機（バックホウ）を使用し、整地及び材料の整理中、誤って架空線に接触したことから漏電し、送電遮断の為、一部地域の停電となった。
	5	平成19年 8月24日 12時05分	転倒	土木工事	底版コンクリート打設中、天端均し作業を行う為、休憩箇所から作業箇所へと鉄筋上を歩行中、左足を鉄筋内に踏み外し、転倒、負傷した。
	6	平成20年 1月18日 22時15分	転倒	土木工事	車道部の不陸整正作業中、現場を通行していた歩行者が、工事看板用照明の電気コードに足を取られ転倒し、負傷した。
	7	平成20年 1月24日 10時40分	激突され	土木工事	バックホウのオペレーターが着ていた衣服に操作レバーが引っ掛かりバックホウが旋回し、付近にいた作業員がバケットと接触し負傷した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
H20	1	平成20年 5月 23,25日 19時10分他	交通事故	舗装工事	舗装打替え工事中における交通開放時に、既設舗装部分との段差部でﾊﾞｲｸが転倒し、運転手が負傷した。
	2	平成20年 7月3日 10時50分	墜落・転落	土木工事	吊り足場の解体作業中、撤去中の固定されていない足場板に乗り、転落した。作業員は安全帯を使用していなかった。
	3	平成20年 8月11日 10時30分	激突され	維持管理	クレーン付トラックで草刈機を吊り上げた状態で移動したところ、トラックが傾き横転し、クレーン操作者が操作ボタンを持っていた左腕をトラックの下に挟まれ負傷した。
	4	平成20年 11月1日 13時10分	墜落・転落	機械設備	点検用架台の据付作業中、吊上げていたチェーンブロックから吊ワイヤーが外れ、水平状態であった点検架台が垂直に傾き、点検架台上で作業していた作業員2名がやか3m下の床面に墜落した。
	5	平成21年 1月26日 16時05分	激突され	舗装工事	被災者が下層路盤敷均し補助作業を行うため、ブルドーザーの後方を斜め横断する際に、ブルドーザーが急に後退し始めたことから接触し、負傷した。
	6	平成21年 3月24日 11時50分	激突され	下水道工事	ブルドーザのギアが前進に入ったままで誤ってブレーキを外し、前方にいた補助作業員と接触した。
H21	1	平成21年 10月23日 9時25分頃	切れ、こすれ	建築工事	電動グラインダーで解体作業を行っていたが、カット部分が不明なため、グラインダーを止め確認しようとしたところ余回転のサンダーの刃が左手中指に接触し負傷した。
	2	平成22年 2月1日 11時20分頃	墜落・転落	土木工事	高所で通路用の足場板を番線で固定する作業を行っていたが、次の箇所へ移動する際、一旦、安全帯フックを親綱から外し移動していた際、床面に墜落し負傷した。
	3	平成22年 2月10日 9時10分頃	飛来、落下	舗装工事	住宅の出入り口を敷鉄板により養生しようとし、ﾊﾞｯｸﾎｳで吊上げ作業を行っていたところ、ﾌｯｸが外れ、敷鉄板が作業員の足に落下した。
H22	1	平成22年 4月23日 11時50分頃	墜落・転落	建築工事	校舎棟ホールにおける、コンクリート梁の清掃作業を行うため、2段梯子を立て掛け作業していた。作業終了後、梯子から降りる途中に墜落し負傷した。
H23	1	平成23年 8月17日 14時30分頃	墜落、転落	建築工事	屋内でコンクリート柱の撤去作業を脚立（6尺）を用いて、作業を続けていたところ、脚立より降りる途中でバランスを失い墜落し負傷した。
	2	平成24年 1月10日 9時50分頃	倒壊	土木工事	U型側溝を布設するため、作業員が掘削箇所の床付作業を行っていたところ、堀山に隣接するブロック塀（空洞ブロックH＝０．６m、ネットフェンH＝１．２m）が掘削箇所に転倒し、作業員が足を挟まれ右足を負傷した。
H25	1	平成25年 10月24日 16時00分頃	墜落	とび・土工・コンクリート	B棟校舎外部（給食室屋上）で養生足場の台風養生のための壁控え（単管パイプ）の取付作業を行っていたが、安全帯のフックの掛け替えの際にバランスを崩して2段目（高さ約3.6m）の足場から墜落し、負傷した。
	2	平成25年 11月15日 12時30分頃	墜落	管工事	ひさし部分から梯子で降りる途中、転落した。
	3	平成25年 11月15日 16時00分頃	墜落	維持管理	クスノキの枝剪定作業終了後、木から降りようと安全帯を外した際に、足を掛けていた枝が折れ、3mの高さから墜落し、負傷した。
	4	平成26年 2月5日 12時07分頃	重機	舗装	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰで転圧作業中、運転手がﾛｰﾗｰを停止し、降りようとしたところ、安全ﾁｮｯｷが操作ﾚﾊﾞｰに引っ掛かり、ﾛｰﾗｰが後進し、かつ運転手が落下し前輪（鉄輪）に轢かれ、負傷した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
H26	1	平成26年 8月20日 10時15分頃	墜落、転落	維持管理	現場作業員が吐出管の清掃作業を実施していたが、マンホール内に入り、頭が出る状態で作業を行っていたところ、誤って転落したと思われる。
	2	平成26年 11月22日 2時54分頃	交通事故（道路）	―	夜間作業にて区画線設置作業を実施し、作業終了後に保安施設の点検確認を行っていた際に、加害者の運転する乗用車が保安施設に衝突し、乗用車により引きづられた保安施設が交通誘導員に接触し負傷した。
H27	1	平成27年 8月31日 9時10分頃	墜落、転落	維持管理	施設内3階の消防設備（感知器）の点検をしていたところ、地下2階まで吹き抜けている送風機ダクト脇の開口部より転落した。
	2	平成27年 9月1日 10時50分頃	墜落、転落	造園工	クスノキの剪定作業中、足を掛けていた枝が折れ4mの高さから墜落した。
	3	平成27年 11月30日 11時25分頃	切れ、こすれ	建築工事	手袋をして巾150ミリのコンクリート用合板を定置式丸ノコで切断加工中、切り残しの部分を切断する際に、ハンマーの柄で板を押し込み、丸ノコに右手が接触した。
H28	1	平成28年 6月6日 13時35分頃	飛来、落下	解体	杭引抜作業に従事していたところ、地上へ引き上げた杭の杭頭部　L＝2．4m（重量　約680kg）が折れ、直下にいた作業員へ落下、衝突した。
	2	平成28年 6月3日 10時50分頃	激突され	造園工	搭乗式草刈機のキャタピラの交換作業中、剥き出しの駆動輪に足を挟んだ。
	3	平成28年 6月28日 10時31分頃	墜落、転落	建築工事	被災者（スクラップ回収業者）は車両上部のクレーン運転台において積み込み作業をしていたが、積荷の整理のため地上に降りようとした際、昇降ステップから足を滑らせ地上に転落した。
	4	平成28年 8月7日 17時30分頃	飛来、落下	設備工事	冷暖房機取付用の架台（（受枠）約90kg）をチェーンブロックで吊上げた後、固定用ナットを取り付けようとしたところ同架台を支えるアンカーが抜け落ち、約70cm下の足場板まで架台が落下し、従事していた作業員2名が足を挟む等負傷した。
	5	平成29年 1月12日 15時38分頃	激突され	下水道	立坑内で既設雨水管（径1200）の一部を取り壊す作業を行っていたところ、近くにいた作業員が立坑（ライナープレート）とバケットに挟まれ被災した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
H29	1	平成29年 5月6日 13時40分頃	墜落、転落	建築	床スラブを斫り、発生材を昇降口屋上（地上約3．5m）から校舎1階昇降口脇に横付けしたコンテナに投下していた際に、作業員がバランスを崩し、昇降口屋上から昇降口壁とコンテナ間の犬走り部分に落下した。
	2	平成29年 5月9日 8時20分頃	飛来、落下	土木	現場横の置き場内において、敷鉄板に生じた段差を直すため、バックホウのアームのフックに吊り金具を取り付け、敷鉄板を吊り上げた状態で、下の端太角を撤去しようとしたところ、端太角を持っていた作業員の両手の上に敷鉄板が落下した。
	3	平成29年 7月7日 13時50分頃	破裂	土木	人孔築造施行中、立抗ケーシング切断の為、酸素ボンベに圧力調整器を取り付け、コックを開いたところ圧力調整器のガラス等が飛び散り作業員が負傷した。
	4	平成29年 8月25日 13時00分頃	墜落、転落	土木	消化タンク棟接続部の鉄筋組立時、内足場2段目開口部（一時的に階段撤去）から1段目に作業員が落下した。
	5	平成30年 2月24日 1時00分頃	火災	建築	庇周辺のパネル溶接作業中に、溶接火花により階下の倉庫（モノレール千葉駅舎内）内の荷物に引火し火災が発生した。
H30	1	平成30年 7月2日 15時20分頃	切れ、こすれ	造園	法面をロータリー式芝刈機で芝刈作業をしていた。傾斜が急なところで、芝刈機が下がってきたため、作業体勢を戻すために、芝刈機本体を押し上げようとしたが、ハンドルが前方に上がったことにより、ロータリー刃がむき出しになりロータリー刃のカバーに足をかけて押さえようとしたところ、右足がロータリー刃に接触し、負傷した。
	2	平成30年 11月21日 14時45分頃	墜落、転落	造園	高さ3m程度のｿﾒｲﾖｼﾉの枝を剪定し,次点の枝に移動しようと梯子から降りる際、2m程度の高さで足を踏み外し墜落した。
	3	平成30年 12月7日 13時00分頃	物損事故	とび・土工・コンクリート	鋼矢板の打設作業において、地下の汚水管を破損させた。現地の汚水管は台帳と異なる経路で配置されていた。
	4	平成31年 2月2日 8時30分頃	墜落、転落	造園	水路脇、法面上に停車中の車のドアを開けようとしたところ、掴み損ね、転倒し、法下まで転落し、負傷した。
	5	平成31年 2月15日 9時40分頃	墜落、転落	調査	人孔内の中間スラブ上での写真撮影中に、中間スラブの昇降用の開口部から下層の中間スラブへ転落した。
	6	平成31年 3月13日 13時40分頃	物損事故	とび・土工・コンクリート	高欄部に設置していた養生シートを固定していた紐が強風により切れたことにより、シートが外れ、JR内房線軌道内下り線の架線に絡んだことにより、列車の運行を停止させた。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R1	1	平成31年 4月10日 16時30分頃	交通事故	下水道	復旧箇所の一部が沈下(1.3×1.3×0.1m)し、被害者が運転していた原動機付自転車が沈下箇所を通過した際、既設舗装との段差にハンドルをとられ転倒した。
	2	令和元年 9月5日 23時30分頃	交通事故	下水道	片側交互通行の規制をかけていた工事現場へ向かって、自動車が接近してきたため、交通誘導員が制止を促したが　制止を無視し交通誘導員に衝突した。
	3	令和元年 9月14日 3時30分頃	物損事故	舗装	重機(チップスプレッダ)回送の為、重機の積込を行っている際に、オペレーター席の庇をNTT線に引っ掛け、NTT回線を断線させた。
	4	令和元年 11月18日 13時30分頃	物損事故	建築	ポーチのコンクリート斫り時に騒音対策として設置していた、防音シートを付けた移動式足場が風にあおられ、付近に停めてあった車両に転倒した。
	5	令和元年 11月24日 18時頃	交通事故	土木	取付管布設工事にて常温合材で仮復旧を行っていた箇所が、雨等の原因により、剥がれ、轍ができてしまっており、自動二輪車で走行していた被害者が轍にハンドルを取られ、転倒した。
	6	令和元年 12月3日 9時50分頃	飛来・落下	土木	伐木作業を実施していた際に、伐倒木が予定外の方向に倒れ、付近で作業をしていた作業員に直撃した。
	7	令和元年 12月9日 9時頃	物損事故	道路	PC壁体の打設作業を行っていた際に、かまし材として使用していたヤットコが近接施設の屋根の一部に接触し、変形した。
	8	令和元年 12月11日 2時20分頃	交通事故	下水道	片側3車線の道路のうち、中央部の一車線を交通規制し実施していた工事現場にタンクローリーが衝突した。
	9	令和2年 1月29日 18時頃	その他	下水道	被災者が本工事で築造していた立坑付近の歩道を通行中、歩道内に発生していた陥没箇所へ落下した。
	10	令和2年 2月12日 18時頃	その他	舗装	被災者が歩行中、マンホールと舗装の擦り付け部約1cmの段差に躓き転倒した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R2	1	令和2年 6月27日 15時30分頃	墜落、転落	造園	剪定した枝が被災者の使用していた三脚に衝突。三脚から飛び降りた際に着地に失敗し、右足関節を脱臼骨折した。
	2	令和2年 7月10日 14時40分頃	飛来、落下	造園	樹木の伐採作業中、伐倒木が想定外の方向に倒れ、付近で作業をしていた被災者の頭部と胸部に接触した。
	3	令和2年 8月11日 11時10分頃	飛来、落下	管	既設天井配管の解体作業を作業員2人で行っていた。1人が脚立足場にて配管切断作業を行い、 被災者は補助として地上で支えていた。配管（約1.8m、約70kg）の切断後に重さを支えきれなくなり、被災者の右足親指に配管が 落下し骨折した。
	4	令和2年 9月1日 9時50分	物損事故	舗装	道路掘削時に、既設水道管をバックホウで破損し、数世帯が断水した。
	5	令和2年 9月16日 13時50分	飛来、落下	管	配管のねじ切り作業の準備中に、受け台から配管が作業員の左手に落下した。
	6	令和2年 11月21日 11時45分	物損事故	土木	路面の掘削時に、既設給水管を破損させた。
	7	令和2年 12月11日 13時10分	墜落、転落	建築	フェンスを乗り越える際にバランスを崩し、転倒した。
	8	令和2年 12月14日 10時35分	はさまれ、巻き込まれ	舗装	後退してきたバックホウが作業員の左足を轢いた。
	9	令和3年 1月7日 13時50分	物損事故	土木	施工区域に隣接した片側交互通行区間を自家用車にて走行中、工事規制帯のフェンスが暴風で倒れ、車両と接触した。
	10	令和3年 2月16日 11時10分	墜落、転落	造園	高所作業車にて樹木の剪定作業中をしていたところ、剪定した枝が接触し、高所作業車から落下した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R3	1	令和3年 4月28日 10時30分	物損事故	土木	路面の掘削時に、既設給水管を破損した。
	2	令和3年 5月18日 14時00分	はさまれ、巻き込まれ	建築	ブレーカー（10kg）を使用した躯体のアゴを斫る作業中にノミが滑りノミ先端が右足甲に当たり負傷した。
	3	令和3年 5月28日 14時50分	物損事故	土木	路面の掘削時に、既設給水管を破損した。
	4	令和3年 7月15日 15時30分	切れ、こすれ	造園	ヘッジトリマーを使用し低木刈込中に、機械に絡んだツルを除去しようとしたところ、誤って右手小指を切傷した。
	5	令和3年 8月18日 15時30分	その他	土木	現場作業中に熱中症による立ち眩みにより、救急車にて搬送された。
	6	令和3年 8月24日 14時00分	はさまれ、巻き込まれ	管	撹拌機の電源コードの絡まりを除去する際に、手を巻き込み小指の第2関節より上部を切断した。
	7	令和3年 9月6日 13時30分	物損事故	土木	拡幅部の路盤工を実施する前に、作業ヤードを確保するため、現地に置いていたフレコンパックをバックホウで移動した際に、バックホウの排土板が路盤面より、15cm高かったガス蓋に接触し、ガス蓋に取り付けられている立上り管を変形、破損させた。
	8	令和3年 9月8日 8時30分	物損事故	土木	バックホウにてコンクリート殻積込時に旋回をしてNTT通信線と接触し切断した。
	9	令和3年 9月28日 10時00分	激突	建築	被災者が可燃ごみをコンテナから搬出するために足場を通過した際に、足場の端部に頭部が衝突し、頭頂部を裂傷した。
	10	令和3年 11月1日 14時00分	物損事故	建築	土工事の作業終了後の撤収時に、油圧ショベル（バケット容量0．3㎥）を旋回し、アーム部分が管理詰所の屋根に衝突した。
	11	令和3年 11月30日 11時00分	物損事故	建築	既存といの撤去作業中に、撤去したといを落下させてしまい、窓ガラスを破損させてしまった。
	12	令和4年 2月18日 15時55分	転倒	土木	生コン車へつながる配管が転倒し、被災者の背中に激突、その弾みで転倒し左膝を負傷した。
	13	令和4年 2月19日 8時50分	墜落、転落	土木	介錯ロープがはずれ被災者が後方に転倒した弾みで前腕を受傷した。
	14	令和4年 3月30日 10時10分	物損事故	土木	掘削作業中にバックホウのバケット先端が水道取出し管を引張り損傷した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R4	1	令和4年 5月21日 13時45分	物損事故	土木	浄水場内の配水管切回しのため、人力及びバックホウを併用して掘削作業を行っていたところ、埋設されていた水道給水管をバックホウのバケットにより破損させた。
	2	令和4年 6月1日 10時55分	物損事故	土木	既設水路の撤去作業の前段として、車道部の舗装を剥がす際、水道管（φ75・土被り25cm 、防護 コンクリート・土被り5cm を 圧砕機で破損させた。
	3	令和4年 8月23日 12時20分	転落	土木	街路灯の移設作業において、移設先の開口部に作業員が転落し、移設中の照明柱基礎と作業員の左肩が接触し、骨折した。
	4	令和4年 9月12日 11時30分	転倒	定期修繕	焼却炉定期修繕作業における足場解体で、足場材の運搬時に躓いて転倒し、積上げた足場材及び床面に右肩を強打した。
	5	令和3年 8月18日 15時30分	飛来	土木	立坑下部の埋戻し完了後、2 段目土留め解体作業で被災者がコーナーピースを取外そうとして、弾けたコーナーピースが左胸部に当たって打撲した。
	6	令和5年 1月26日 10時15分	物損事故	土木	側溝敷設の前段として土砂掘削をした際に、水道管（φ20・土被り60cmの宅内引込管）に気付かず、バックホウで水道管を破損させた。
	7	令和5年 2月10日 11時00分	転落	造園	公園樹木の剪定を行っていたところ、落ちた枝が三脚脚立にあたり、脚立（3.5m）が倒れ、1.6mの高さから地面に体の左側から転落し、手首等を負傷した。
