ボーリング柱状図

調査名　仮称中央区老人福祉センター・デイサービスセンター新築地質調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No.1		調査位置	千葉市中央区松ヶ丘町257-1，258-1					北緯		
発注機関	千葉市役所				調査期間	平成 6年 9月21日 ～ 6年 9月22日			東経		
調査業者名			主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	H= 0.16m	角度	180° 上 下 90°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 90°	使用機種	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	コーンブーリー
総掘進長	17.45m								エンジン	NS-75	ポンプ	V-6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事		孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
	0.06	0.10	0.10		盛土	暗褐			主に粘土質ガラ若干混入	B														
	-0.24	0.30	0.40																					
1					ローム	茶褐			含水分中位 粘性中位 所々黒褐の風化物少量混入	Lm		1.15	1/15	1/15		2/30								
2												1.45 2.15	1/16	1/16		2/32								
	-2.64	2.40	2.80								2.85	2.47												
3					粘土質ローム	暗黄褐			含水分中位 粘性中位			3.15	1	1	1	3/30		3.00	孔内水平載荷試験 K=4.99 E=27.34					
	-3.64	1.00	3.80									3.45 4.15	1	1	2	4/30								
4					砂質粘土	暗黄褐			含水分中位 粘性中位 全体に少量の砂及び黒褐の風化物混入															
5												4.45 5.15	1	1	2	4/30								
	-5.44	1.80	5.60							Lc		5.45												
6					粘土	暗黄褐			含水分中位 粘性大位			6.15	3	4	5	12/30								
7									全体に少量の砂及び風化物混入			6.45 7.15	4	5	5	14/30								
	-7.54	2.10	7.70									7.45 8.15	15	17	18/7	50/27								
8												8.42 9.15	9	13	13	35/30								
9												9.45 10.15	20	18	12/5	50/25								
10												10.40 11.15	21	29/8		50/18								
11												11.33 12.15	26	24/8		50/18								
12					細砂	暗黄灰			含水分中位 粒子均一 雲母片若干混入 全体に少量の中砂混入 17.00m付近より全体に極少量のシルト及び微細砂混入	Ds1		12.33 13.15	25	25		50/20								
13												13.35 14.15	24	26/9		50/19								
14												14.34 15.15	27	23/7		50/17								
15												15.32 16.15	25	25/8		50/18								
16												16.35 17.15	11	12	12	35/30								
17	-17.29	9.75	17.45									17.45												

ボーリング柱状図

調査名　仮称中央区老人福祉センター・デイサービスセンター新築地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.2	調査位置	千葉市中央区松ヶ丘町257-1，258-1						北緯		
発注機関	千葉市役所			調査期間	平成 6年 9月24日～ 6年 9月26日				東経		
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者			ボーリング責任者		
孔口標高	H= 0.01m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	コーンブーリー
総掘進長	17.35m								エンジン	NS-75	ポンプ	V-6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事		孔内水位 (m) 測定月日
	-0.00	0.10	0.10		砕石						
1	-1.49	1.40	1.50		盛土	暗褐			含水分中位 粘性中位 主に粘土質	B	
2					粘土質ローム	暗茶褐			含水分中位 粘性中位 4.00m付近より全体に黒褐の風化物及び少量の砂混入	Lm	
3											
4											4.40 ▽
5											
6					粘土	暗黄褐			含水分中位 粘性大位 全体に少量の砂混入	Lc	
7	-7.59	2.10	7.60								
8					細砂	暗黄灰			含水分中位 粒子均一 全体に雲母片及び中砂若干混入 10.00m付近より全体に微細砂多量混入 12.00m付近より締まり硬質 15.00m付近より全体に極少量のシルト混入	Ds1	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17	-17.34	9.75	17.35								

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)
1.15	1/14	1/16		2/30
1.45～2.15	1	1	2	4/30
2.45～3.15	1	2	2	5/30
3.45～4.15	1	1	2	4/30
4.45～5.15	1	2	3	5/30
6.15	3	3	3	9/30
6.45～7.15	3	3	4	10/30
7.45～8.15	12	12	13	37/30
8.45～9.15	13	14	15	42/30
9.45～10.15	11	12	12	35/30
10.45～11.15	12	12	12	36/30
11.45～12.15	50			50/10
12.25～13.15	50/9			50/9
13.24～14.15	50			50/10
14.25～15.15	24	26		50/20
15.35～16.15	23	25	2/1	50/21
16.36～17.15	23	27		50/20
17.35				

N値

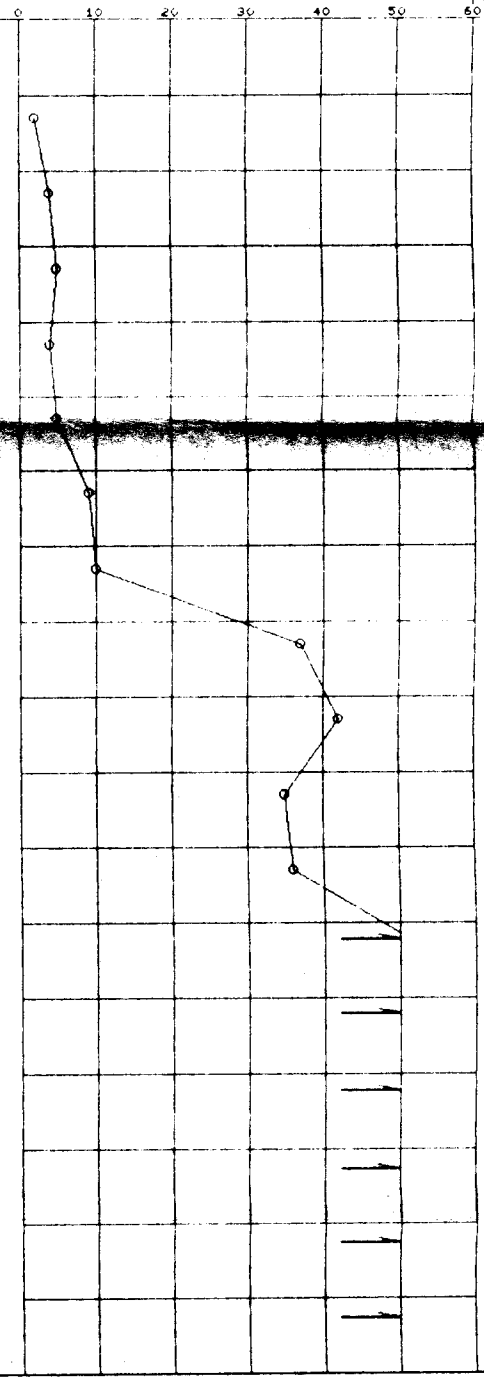

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法
2.00	2-1	
2.80		
6.15	2-2	
6.45		

室内試験 ( )

掘進月日

9/24

9/26
