土　質　柱　状　図　　報　告　用　紙

調査名・調査地点　千葉市立横戸小学校増築地質調査　　標　高　　m　　調査年月日　54年5月1日～54年5月2日

ボーリング孔：No.　1　　孔内水位　－8.75　m　　調査担当者

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録 土質記号	土質名	色調	記事
1					ローム	茶褐	0.00～0.20 砕石混り埋土
2							含水量中
3		3.80	3.80				雲母及び浮石を少量混在
4		4.35	0.55		凝灰質粘土	乳黄灰	火山灰多量混在
5					粘土質細砂	黄褐	含水量中 上部黄褐灰色の細砂を狭み所々に粘土を混在 浮石火山灰を多量混在
6		6.50	2.15				
7					砂質シルト	黄灰	含水量中 雲母を少量混在、全体に砂質分を多く混在
8		8.10	1.60				
9					貝殻混り中砂	暗黄灰	含水量大 雲母を少量混在、全体に貝殻片を多量混在
10		9.50	1.40				
11					細砂	黄褐灰～暗黄褐	含水量中 雲母を少量混在 貝殻片を点在
12		12.80	3.30				全体に粒度均質
13							含水量大
14					貝殻混り中砂	暗黄灰	雲母を少量混在 貝殻片を非常に多く混在
15							
16							
17		17.60	4.80				
18					貝殻混り中砂	暗黄褐	含水量中 雲母を少量混在 貝殻片を多量混在 全体に非常に締っている
19							
20		20.30	2.70				
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	6/30	2	2	2
1.45～2.15	4/31	1	1	2/11
2.46～3.15	3/30	1	1	1
3.45～4.15	12/30	1	4	7
4.45～5.15	10/30	3	3	4
5.45～6.15	11/30	4	3	2
6.45～7.15	2/33	1/20	1/13	
7.48～8.15	13/30	3	5	5
8.45～9.15	15/30	4	5	6
9.45～10.15	22/30	6	8	8
10.45～11.15	24/30	6	8	10
11.45～12.15	29/30	8	9	12
12.45～13.15	44/30	10	14	20
13.45～14.15	50/28	16	18	16/8
14.43～15.15	50/25	18	20	12/5
15.40～16.15	50/20	19	31	
16.35～17.15	50/21	20	26	4/1
17.36～18.15	50/22	19	20	8/2
18.37～19.15	50/25	20	20	10/5
19.40～20.15	50/15	30	20/5	
20.30				

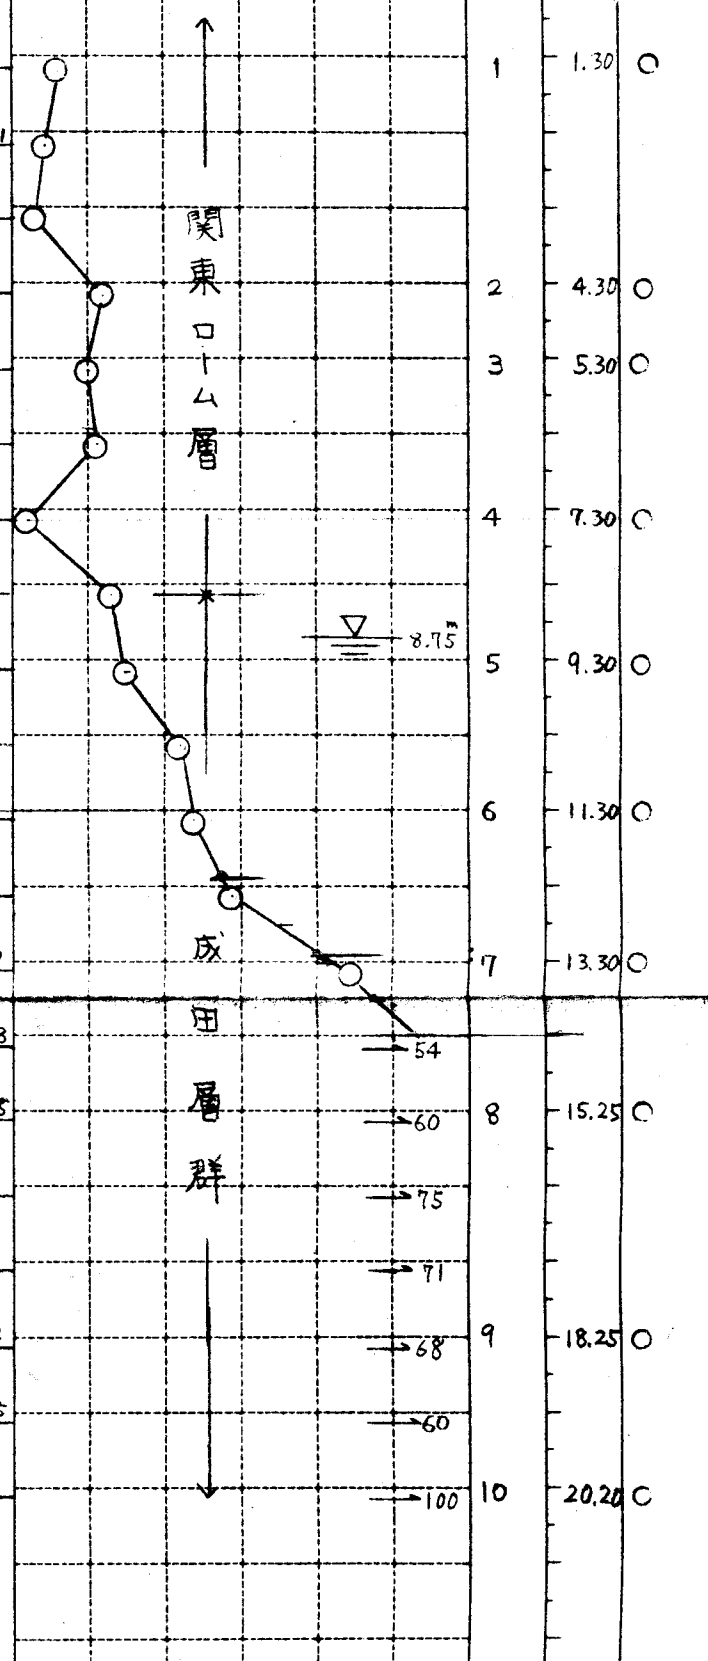

試料採取 試料番号	深さ m	採取方法
1	1.30	○
2	4.30	○
3	5.30	○
4	7.30	○
5	9.30	○
6	11.30	○
7	13.30	○
8	15.25	○
9	18.25	○
10	20.20	○

備　考：

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー　　◉ デニソン型サンプラー

○ 貫入試験用サンプラー　　⊕ フォイルサンプラー

× そ の 他
