

平成26年度
監 査 報 告 書
(I)

第1期工事定期監査結果報告

千葉市監査委員

26 監査報告第7号
平成26年11月4日

千葉市議会議長 宇留間 又衛門 様
千葉市長 熊谷 俊人 様

千葉市監査委員 宮 下 公 夫
同 宮 原 清 貴
同 小 川 智 之
同 川 岸 俊 洋

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、
同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第1期工事定期監査結果報告

1 監査の対象

建設局、水道局

2 監査の範囲

平成25年度に実施した工事及び業務委託

3 監査の期間

平成26年4月1日から平成26年10月29日まで

4 監査の方法

今回の監査は、監査対象工事358件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施工事100件、監査対象業務委託98件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施業務委託30件について、工事及び業務委託が設計、積算、契約、施工等の各段階において、技術面から適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の視点にも留意し、設計図面、仕様書、設計書、契約書、施工計画書、工事記録写真、品質報告書等の関係書類を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、実地調査を行った。

<主な着眼点>

(1) 設計・積算

- ・ 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- ・ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。
- ・ 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。
- ・ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- ・ 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。

(2) 契約

- ・ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。
- ・ 契約の履行期限は守られているか。
- ・ 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。

(3) 施工・検査

- ・ 工事施工計画は適切か。
- ・ 設計図書どおり施工されているか。
- ・ 法令等を遵守して施工されているか。
- ・ 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。
- ・ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。
- ・ 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

5 監査の結果

監査の対象局における工事及び業務委託のうち、契約、検査については、おおむね適正に執行されていたが、積算及び施工について次のとおり改善すべき事項が認められた。

(1) 積算について改善すべき事項

ア 諸経費の積算を適正に行うべきもの

[建設局：宮野木町108号線外1道路改良工事]

土木工事積算基準によると、工事費における諸経費の算出は、直接工事費などの対象額に経費率を乗じて得た額とされているが、地質分析費や水質分析費などについては、共通仮設費に積み上げて計上することとされ、現場管理費及び一般管理費における対象額からは控除して積算することとされている。

しかしながら、本工事においては、場外へ搬出する現場発生土に含まれる六価クロムや有機リンなど有害物質の含有量を調査するための地質分析費について、共通仮設費には積み上げて計上していたものの、現場管理費及び一般管理費における対象額からは控除していなかった。

諸経費の積算については、土木工事積算基準に基づき適正に行われたい。

※1 工事費の積算体系

$$\text{工事費} = \text{直接工事費} + \text{諸経費} + \text{消費税}$$

諸経費	共通仮設費…	仮囲いや現場事務所など、施工に共通的に必要な経費 【 ^[a] <u>直接工事費の対象額</u> × 経費率 + 積上げ分(地質分析費など)】
	現場管理費…	現場従業員の給与や工事保険など、工事を管理するために必要な経費 【 ^[b] <u>(直接工事費+共通仮設費)</u> の対象額 × 経費率】
	一般管理費…	固定資産税等の租税など、会社の本支店での必要経費 【 ^[c] <u>(直接工事費+共通仮設費+現場管理費)</u> の対象額 × 経費率】

※2 地質分析費に係る諸経費の算出

区 分		(正)	(誤)
諸経費	共通仮設費	a × 経費率 + 地質分析費	※正しく積算していた。
	現場管理費	(b - 地質分析費) × 経費率	(b - <u> </u>) × 経費率
	一般管理費	(c - 地質分析費) × 経費率	(c - <u> </u>) × 経費率

地質分析費を控除していなかった。

(2) 施工について改善すべき事項

ア 土砂運搬における運搬計画の届出を適正に行うべきもの

[建設局：金親町69号線道路新設工事（25-1）]

千葉市土砂運搬適正化対策要綱によると、市長は、5,000立方メートル以上の土砂の運搬を行おうとする運搬事業者に対し、土砂運搬による騒音及び振動等によって生活環境が損なわれることなどを防止するため、土砂の運搬を行おうとする日の30日前までに、運搬路線を示す図面、交通監視員及び道路清掃員の配置図等を添付した運搬計画を届け出させるものとされている。

しかしながら、本工事においては、道路を新設するため、6,500立方メートルの土砂を掘削し場外へ搬出したにもかかわらず、届け出させていなかった。

土砂運搬における運搬計画の届出については、千葉市土砂運搬適正化対策要綱に基づき適正に行われたい。

イ 下水道工事における路床部の施工を適正に行うべきもの


[建設局：下水道排水施設工事（神明雨水25-4工区）]

道路法施行規則によると、占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、各層ごとにランマーその他の締め固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこととされ、層の厚さは原則として30センチメートル以下、路床部にあっては20センチメートル以下とするとされている。

しかしながら、本工事においては、道路を掘削し、下水道管等を布設した後、土砂を埋め戻す際に、路床部の各層の厚さを20センチメートル以下とすべきところ、30センチメートルごとに締め固めていた。

下水道工事における路床部の施工については、道路法施行規則を遵守し、適正に行うよう受注者を指導されたい。

※アスファルト舗装の構成

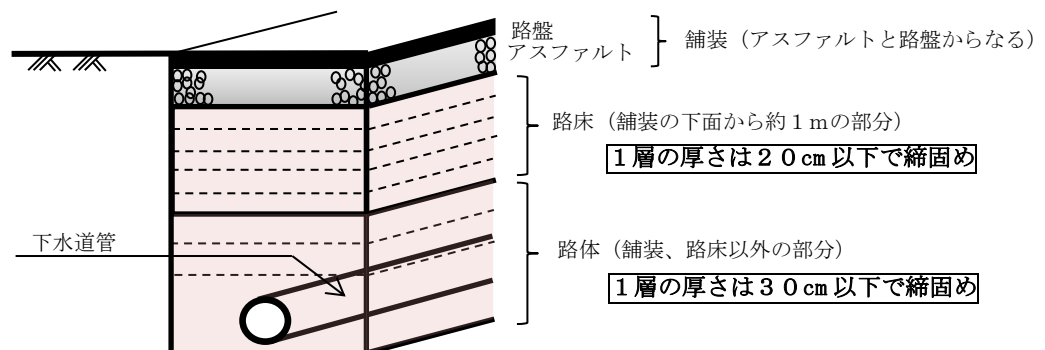

ウ 特定建設作業に係る届出を適正に行うべきもの

[建設局：排水施設改良工事（宇那谷調整池25-1工区）]

騒音規制法及び振動規制法によると、さく岩機などを使用し、騒音及び振動を発生させる特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、騒音及び振動の防止の方法などを市長に届け出なければならないとされている。

しかしながら、本工事においては、さく岩機を用いてコンクリート構造物を取り壊す特定建設作業を行っていたにもかかわらず、届出を行っていなかった。

特定建設作業に係る届出については、騒音規制法等を遵守し、適正に行うよう受注者を指導されたい。

建設局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工 事 箇 所	契 約 金 額 (円) (下段：変更後)	工 期			
						上 段 ： 自	中 段 ： 至 下 段 ： 変 更 後		
土 木 部	自 転 車 対 策 課	1	磯辺畑町線自転車専用通行帯整備工事	千葉市花見川区朝日ヶ丘町地内外	13,072,500 13,080,900	H25. 7. 10	H25. 11. 6		
		2	蘇我駅第1自転車駐車場整備工事	千葉市中央区南町2丁目地内	16,569,000	H25. 7. 20	H25. 12. 6		
	中 央 ・ 美 浜 土 木 事 務 所	3	新町若松町線舗装改良工事	千葉市中央区祐光2丁目地内外1	26,197,500 32,454,450	H25. 1. 18	H25. 3. 18	H25. 7. 31	
			4	今井陸橋耐震補強工事	千葉市中央区今井3丁目地内外3	140,175,000 140,055,300	H25. 3. 27	H26. 1. 10	H26. 3. 25
		5	国道126号院内小学校入口交差点改良工事	千葉市中央区院内1丁目地内外3	24,150,000 21,079,800	H25. 3. 29	H25. 7. 26	H25. 9. 30	
		6	国道14号外地点名標識設置工事	千葉市中央区富士見2丁目地内外	5,621,700 6,352,500	H25. 6. 11	H25. 9. 8	H25. 10. 31	
		7	磯辺橋補修工事	千葉市美浜区磯辺8丁目地内外3	117,633,600 123,276,300	H25. 6. 12	H26. 1. 7		
		8	南生実町84号線外1舗装新設工事	千葉市中央区南生実町地内	3,720,150 4,441,500	H25. 6. 15	H25. 9. 2		
		9	寒川町1号線外道路照明灯設置工事	千葉市中央区港町地内外	7,980,000 9,101,400	H25. 7. 20	H26. 1. 15	H26. 1. 31	
		10	新旭橋補修工事	千葉市中央区旭町地内外2	9,817,500 11,053,350	H25. 8. 21	H25. 12. 18		
		11	(主)千葉大綱線(仁戸名町地区)舗装改良工事	千葉市中央区仁戸名町地内外1	64,995,000 72,094,050	H25. 9. 28	H26. 3. 6		
		12	幕張西1号線舗装改良工事	千葉市美浜区幕張西3丁目地内	7,741,650 9,519,300	H25. 10. 8	H25. 12. 26	H26. 1. 31	
		13	安全施設等設置工事(中25-2)	千葉市中央区長洲1丁目地内外	7,540,050 9,795,450	H25. 10. 19	H26. 1. 16	H26. 1. 31	
		14	幸町16号線生活関連経路整備工事	千葉市美浜区幸町1丁目地内	26,098,800 28,850,040	H26. 1. 21	H26. 3. 18	H26. 6. 20	
		15	豊砂陸橋耐震補強工事	千葉市美浜区豊砂地内	189,000,000 216,469,800	H26. 1. 28	H26. 10. 24	H26. 11. 28	
		花 見 川 ・ 稲 毛 土 木 事 務 所	16	犢橋町37号線道路補修工事	千葉市花見川区犢橋町地内	12,823,650 16,518,600	H24. 12. 7	H25. 3. 18	H25. 5. 15
				17	(主)浜野四街道長沼線舗装改良工事	千葉市稲毛区長沼原町地内	14,919,450 15,537,900	H25. 5. 23	H25. 9. 19
			18	宮野木町108号線外1道路改良工事	千葉市稲毛区宮野木町地内	66,990,000 82,373,550	H25. 5. 31	H26. 1. 25	H26. 2. 28
			19	作草部町60号線外1側溝新設工事	千葉市稲毛区作草部町地内外1	4,047,750 5,246,850	H25. 6. 21	H25. 9. 8	
			20	天戸町横戸町線舗装改良工事	千葉市花見川区花見川地内外1	9,500,400 11,177,250	H25. 6. 26	H25. 9. 3	

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	花見川・稲毛土木事務所	21	宮野木町4号線交差点改良工事	千葉市花見川区宮野木台4丁目地内外3	98,700,000 94,516,800	H25. 6. 28 H26. 2. 22 H26. 3. 25
		22	安全施設等設置工事(花25-1)	千葉市花見川区南花園1丁目地内外	2,651,250 3,168,900	H25. 7. 12 H25. 10. 9
		23	花島橋外1橋梁補修工事	千葉市花見川区花島町地内外3	52,290,000 54,957,000	H25. 7. 19 H26. 2. 13 H26. 3. 18
		24	(主)穴川天戸線(穴川地区)舗装改良工事	千葉市稲毛区穴川3丁目地内外3	81,704,700 79,753,800	H25. 8. 7 H26. 3. 4
		25	西千葉駅稲荷町線外1道路照明灯設置工事	千葉市稲毛区轟町地内外	3,013,500	H25. 10. 11 H26. 1. 8
		26	柏井町33号線外2道路整備工事	千葉市花見川区柏井町地内外	20,653,500 23,766,750	H25. 10. 16 H26. 3. 18
		27	園生町124号線外8舗装改良工事	千葉市稲毛区柏台地内外5	11,655,000 11,354,700	H25. 12. 14 H26. 3. 3 H26. 3. 18
	若葉土木事務所	28	千城橋耐震補強工事	千葉市若葉区千城台南1丁目地内外1	15,831,154 15,947,400	H25. 3. 16 H25. 6. 30
		29	西千葉駅稲荷町線外歩道段差解消工事	千葉市若葉区高品町地内外	4,651,500	H25. 3. 19 H25. 6. 30
		30	都賀駅大草町線舗装改良工事(貝塚工区)	千葉市若葉区貝塚2丁目地内外	14,155,050	H25. 7. 12 H25. 10. 9
		31	(主)千葉川上八街線舗装改良工事(上泉工区)	千葉市若葉区上泉町地内	26,797,050 27,216,000	H25. 9. 18 H26. 1. 15
		32	(一)誉田停車場中野線舗装改良工事	千葉市若葉区中野町地内	13,605,900 15,253,350	H25. 9. 21 H25. 12. 19
		33	加曾利町102号線外1舗装新設工事	千葉市若葉区加曾利町地内外	4,936,050	H25. 10. 10 H26. 1. 7
		34	中野町64号線舗装改良工事	千葉市若葉区中野町地内	3,709,650 4,062,450	H25. 10. 19 H25. 12. 17
		35	千城台227号線外1側溝改良工事	千葉市若葉区千城台南1丁目地内	6,609,750 6,827,100	H25. 11. 19 H26. 2. 26
		36	更科町12号線外2道路改良工事	千葉市若葉区更科町地内外2	6,720,000	H25. 12. 27 H26. 3. 18
		37	(主)千葉川上八街線外1道路案内標識設置工事	千葉市若葉区金親町地内	13,059,900	H25. 12. 28 H26. 3. 18
	緑土木事務所	38	大木戸町58号線道路整備工事	千葉市緑区大木戸町地内	18,170,250 20,748,000	H24. 11. 29 H25. 3. 18 H25. 5. 31
		39	指定道路高津戸町47号線外3側溝改良工事	千葉市緑区高津戸町地内	16,800,000 17,296,650	H25. 6. 15 H25. 11. 1
		40	誉田歩道橋補修工事	千葉市緑区誉田町2丁目地内	12,757,500 14,519,400	H25. 8. 8 H26. 1. 4
		41	(一)誉田停車場中野線(高田工区)舗装改良工事	千葉市緑区高田町地内	11,468,100 12,907,650	H25. 9. 6 H26. 1. 23

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	緑土木事務所	42	おゆみ野 1 1 8 号線外 3 道路照明灯設置工事	千葉市緑区おゆみ野 6 丁目地内外 3	2,835,000 2,919,000	H25. 10. 10 H25. 12. 18
		43	大木戸町 4 3 号線 (大野台) 舗装改良工事	千葉市緑区大野台 1 丁目地内	12,056,100	H25. 10. 29 H26. 2. 25
		44	(主) 千葉大綱線薄層カラー舗装工事	千葉市緑区越智町地内外 1	10,741,500 11,840,850	H26. 1. 25 H26. 3. 18
土木部 小計				4 4 件	1,234,166,104	
道路部	道路建設課	45	千葉市営住宅宮野木町第 1 団地第二期建替事業造成工事 (その 3)	千葉市稲毛区宮野木町地内	76,230,000	H24. 12. 21 H25. 6. 30
		46	(主) 千葉大綱線 (ニューサンピア千葉) 交差点改良工事	千葉市中央区仁戸名町地内	34,954,500 41,620,950	H25. 1. 26 H25. 8. 23 H26. 1. 31
		47	誉田駅北口線擁壁築造工事 (2 4 - 1 工区)	千葉市緑区誉田町 2 丁目地内	16,769,550 19,578,300	H25. 3. 19 H25. 8. 15
		48	千葉市営住宅宮野木町第 1 団地第二期建替事業雨水貯留槽設置工事	千葉市稲毛区宮野木町地内	28,486,500 33,244,050	H25. 6. 11 H25. 9. 30 H25. 11. 30
		49	千葉市立花島小学校下水道排水施設工事	千葉市花見川区花見川地内	4,247,250	H25. 8. 23 H25. 12. 20
		50	金親町 6 9 号線道路新設工事 (2 5 - 1)	千葉市若葉区金親町地内	113,400,000 119,414,520	H25. 8. 30 H26. 3. 18 H26. 6. 30
		51	三角町柏井町線 (柏井橋) 仮橋架設工事	千葉市花見川区柏井町地内	254,625,000 261,159,150	H25. 9. 25 H26. 2. 21 H26. 3. 18
		52	大木戸町 4 号線道路改良工事	千葉市緑区大木戸町地内	35,332,500 36,641,850	H25. 10. 4 H26. 3. 2 H26. 3. 25
	街路建設課	53	誉田駅北口線街路築造工事 (2 5 - 1 工区)	千葉市緑区誉田町 2 丁目地内	12,325,950 12,472,950	H25. 10. 8 H26. 2. 4
		54	千葉市都保育所外駐車場整備工事	千葉市中央区都町 2 丁目 2 6 番 5 号外	3,517,500	H26. 1. 22 H26. 3. 18 H26. 3. 25
		55	仁戸名町古市場町線道路案内標識設置工事	千葉市中央区南生実町地内	4,005,750 4,131,750	H26. 1. 28 H26. 3. 18
		56	美浜長作町線舗装工事	千葉市花見川区武石町 1 丁目地内外 1	32,025,000 40,139,400	H25. 3. 28 H25. 8. 24
		57	新港横戸町線緑地 A (仮称) 緑道整備工事	千葉市稲毛区黒砂 3 丁目地内	53,540,550 61,107,900	H25. 6. 8 H25. 12. 4
		58	黒砂 F 公園 (仮称) 擁壁整備工事	千葉市稲毛区黒砂 4 丁目地内	31,937,850 34,761,300	H25. 7. 27 H26. 1. 2 H26. 3. 18
		59	一般国道 1 2 6 号 (穴川区間) 交差点改良工事	千葉市稲毛区穴川 3 丁目地内外	29,703,450 30,043,650	H25. 11. 16 H26. 3. 18
		60	大膳野町誉田町線街路築造工事	千葉市緑区誉田町 1 丁目地内	53,028,000 56,207,520	H26. 1. 31 H26. 7. 29 H26. 8. 29
道路部 小計				1 6 件	784,129,350	

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
下水道管理部	下水道維持課	61	草野水路ガードパイプ改修工事	千葉市美浜区高浜6丁目地内外1	2,485,350 2,924,250	H25. 6.22 H25. 10.19
		62	草野水のみち外護岸補修工事 (25-1工区)	千葉市稲毛区稲毛3丁目地内外	11,734,800 17,102,400	H25. 7.10 H26. 1.25
		63	人孔蓋更新工事(磯辺25-1工区)	千葉市美浜区磯辺1丁目地内外	16,478,700	H25. 11.19 H26. 3.18
下水道管理部 小計				3件	30,698,850	
下水道建設部	下水道建設課	64	下水道排水施設工事 (みつわ台調整池23-1工区)	千葉市若葉区みつわ台1丁目地内	85,890,000 108,908,100	H24. 3.28 H25. 1.10 H25. 6.30
		65	下水道排水施設工事 (高品雨水1号幹線24-1工区)	千葉市若葉区高品町地内	98,700,000 100,723,350	H24. 8.23 H25. 2.18 H25. 5.31
		66	下水道排水施設工事(長洲24-1工区)	千葉市中央区長洲1丁目地内	20,774,250 39,083,100	H24. 10.10 H25. 2. 6 H25. 11.30
		67	下水道排水施設工事(神明25-2工区)	千葉市中央区神明町地内外1	160,755,000 185,479,350	H25. 5.28 H25. 11.23 H26. 3.25
		68	マンホールトイレ設置工事 (25-2工区)	千葉市花見川区さつきが丘1丁目地内外4	14,385,000 16,846,200	H25. 6.15 H25. 10.12 H25. 12.12
		69	下水道排水施設工事(六方25-1工区)	千葉市稲毛区六方町地内	11,926,950 12,409,950	H25. 6.25 H25. 9.22
		70	下水道排水施設工事(長洲25-1工区)	千葉市中央区長洲1丁目地内外2	150,675,000 165,442,920	H25. 7. 4 H26. 1.29 H26. 9.30
		71	下水道排水施設工事(末広25-1工区)	千葉市中央区末広1丁目地内外3	173,250,000 197,042,400	H25. 7. 4 H26. 1.29 H26. 4.30
		72	下水道排水施設工事 (神明雨水25-4工区)	千葉市中央区神明町地内	30,366,000 34,193,250	H25. 8. 1 H25. 11.28 H26. 1.31
		73	下水道排水施設工事(市場25-1工区)	千葉市中央区市場町地内外2	92,400,000 98,390,760	H25. 8. 2 H26. 1.28 H26. 5.30
		74	下水道排水施設工事(生実25-1工区)	千葉市中央区生実町地内外2	10,972,500 11,852,400	H25. 8.23 H25. 12.30 H26. 1.17
		75	下水道排水施設工事 (今井雨水25-1工区)	千葉市中央区今井町地内外1	49,560,000 53,241,720	H25. 8.29 H26. 2.24 H26. 4.30
		76	下水道排水施設工事 (椎名崎25-1工区)	千葉市緑区椎名崎町地内外3	27,090,000 27,507,900	H25. 10.24 H26. 3.18 H26. 3.25
		77	舗装復旧工事(中央25-1)	千葉市中央区中央1丁目地内外13	30,553,950 31,450,650	H25. 12. 6 H26. 3.13 H26. 3.20
		下水道再整備課		78	下水道施設改良工事 (都賀の台24-1工区)	千葉市若葉区都賀の台1丁目地内
79	下水道施設改良工事(緑町24-3工区)			千葉市稲毛区緑町1丁目地内外1	91,140,000 100,792,650	H24. 8.25 H25. 3.12 H25. 6.30
80	下水道施設改良工事(椿森24-1工区)			千葉市中央区椿森2丁目地内外4	108,150,000 112,524,300	H24. 10.18 H25. 3.12 H25. 5.31

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
下水道建設部	下水道再整備課	81	下水道施設改良工事（松波24-1工区）	千葉市中央区松波1丁目地内外1	42,321,300 44,355,150	H25. 4.16 H25. 9.22
		82	下水道施設改良工事（院内24-1工区）	千葉市中央区院内2丁目地内外4	80,077,200 81,149,250	H25. 7. 9 H26. 1.24 H26. 2.28
		83	下水道施設改良工事 （富士見24-1工区）	千葉市中央区富士見1丁目地内	85,354,500	H25. 7.17 H25.12.23 H26. 1.31
		84	下水道施設改良工事（真砂25-1工区）	千葉市美浜区真砂5丁目地内外2	67,442,550 77,562,150	H25. 8.13 H26. 3.13 H26. 7.31
		85	下水道施設改良工事 （幕張西25-1工区）	千葉市美浜区幕張西2丁目地内外4	40,950,000 43,219,050	H25. 8.27 H26. 2. 2 H26. 2.28
		86	下水道施設改良工事（高洲25-1工区）	千葉市美浜区高洲1丁目地内外1	55,377,000 55,998,600	H25. 9.14 H26. 3.13
	下水道施設建設課	87	中央浄化センター雨水滞水池機械設備 工事	千葉市美浜区新港69番地	116,865,000 122,236,800	H24. 7.21 H25. 3.12 H25. 5.31
		88	中央浄化センター雨水滞水池電気設備工事	千葉市美浜区新港69番地	166,950,000 170,150,400	H24. 7.21 H25. 3.12 H25. 5.31
		89	南部浄化センター2-1消化タンク機械 設備更新工事	千葉市中央区村田町893番地内	262,500,000 298,062,240	H25. 7. 2 H26. 3.13 H26. 6.30
		90	南部浄化センター汚泥処理監視制御設備 更新工事	千葉市中央区村田町893番地内	409,500,000	H25. 7.23 H26. 3.13 H26. 8.29
		91	大椎ポンプ場外2沈砂池搬送機械設備 更新工事	千葉市緑区あすみが丘5丁目 75番外2	121,527,000	H25. 8. 7 H26. 3.13
		92	南部浄化センター沈砂洗浄施設土木工事	千葉市中央区村田町893番地内	79,800,000 83,866,200	H25. 8.20 H26. 3.13 H26. 4.25
		93	南部浄化センターガスホルダ機械設備工事	千葉市中央区村田町893番地内	591,150,000	H25. 9.13 H27. 2. 4
		94	南部浄化センター沈砂洗浄施設機械設備 工事	千葉市中央区村田町893番地内	435,750,000	H25. 9.13 H27. 2. 4
	都市河川課	95	排水施設新設工事 （南生実町24-1工区）	千葉市中央区南生実町地内外1	13,657,350 14,326,200	H24. 8.29 H24.12.26 H25. 8.31
		96	排水施設新設工事 （辺田排水路25-1工区）	千葉市緑区辺田町地内外1	40,950,000 42,443,640	H25. 9.25 H26. 3.18 H26. 4.30
		97	二級河川坂月川河道築造工事 （25-1工区）	千葉市若葉区小倉町地内外1	66,885,000 74,769,450	H25. 9.27 H26. 3.18 H26. 3.25
		98	排水施設改良工事 （宇那谷調整池25-1工区）	千葉市花見川区宇那谷町地内	20,298,600 21,751,800	H25.10. 8 H26. 3.18
99		急傾斜地崩壊防止工事 （園生町25-1工区）	千葉市稲毛区園生町地内	27,710,550 31,577,700	H25.11.14 H26. 3.18 H26. 3.25	
下水道建設部 小計				36件	3,894,426,900	
建設局				99件	5,943,421,204	

水道局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
1	水道	100	送水管布設工事	千葉県緑区越智町地内外 1	123,480,000 123,635,400	H25. 9.26 H26. 3.18
			水道局	1 件	123,480,000	

※ 水道：水道事業事務所

別表

監査実施業務委託一覧表

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期
						上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	自転車	1	千葉駅東口路上自転車駐車場外設計業務委託	千葉市中央区富士見2丁目地内外	1,276,800 1,712,550	H25. 9. 6 H25. 9. 30 H26. 3. 18
		中・美土木	2	磯辺打瀬線外2道路実施設計業務委託	千葉市美浜区磯辺8丁目地内外	1,256,850
	3		若葉第二号橋外1耐震補強実施設計業務委託	千葉市美浜区打瀬1丁目地内外3	7,187,250	H25. 10. 1 H26. 2. 27
	4		大森町66号線外2道路実施設計業務委託	千葉市中央区大森町地内外2	1,038,450	H26. 1. 31 H26. 3. 18
	花・稲土木		5	稲毛東40号線外歩道段差解消実施設計業務委託	千葉市稲毛区稲毛東3丁目地内外	1,458,450
		6	こてはし台32号線外16道路実施設計業務委託	千葉市花見川区こてはし台3丁目地内外6	2,422,350	H26. 1. 23 H26. 3. 18
	若葉土木	7	(主) 浜野四街道長沼線外3道路実施設計業務委託	千葉市若葉区大井戸町地内外	905,100	H25. 6. 15 H25. 8. 13
		8	川戸橋補修設計業務委託	千葉市若葉区大宮町地内	1,732,500	H25. 9. 6 H25. 12. 4
	緑土木	9	おゆみ野東南部3号線外段差解消実施設計業務委託	千葉市緑区おゆみ野5丁目地内外5	1,101,450	H25. 12. 28 H26. 3. 18
		10	高田町68号線土質調査業務委託	千葉市緑区高田町地内	1,344,000	H26. 1. 15 H26. 3. 25
土木部 小計				10件	19,723,200	
道路部	道路建設課	11	(主) 穴川天戸線(亥鼻橋)橋梁詳細設計業務委託	千葉市花見川区畑町地内外2	31,737,300	H25. 1. 17 H25. 9. 13 H26. 3. 18
		12	高根町54号線道路詳細設計業務委託	千葉市若葉区更科町地内	2,174,550	H25. 7. 4 H25. 10. 31 H26. 2. 28
		13	(主) 千葉大網線(消防総合センター入口交差点)道路詳細設計業務委託	千葉市緑区平川町地内外1	1,739,850	H25. 10. 1 H26. 1. 28
	街路建設課	14	千葉鎌ヶ谷松戸線道路実施設計業務委託	千葉市花見川区武石町1丁目地内外1	4,200,000	H25. 10. 1 H26. 3. 18
		15	松波新港線道路実施設計業務委託	千葉市中央区登戸5丁目地内外1	1,095,150	H25. 10. 22 H26. 3. 25
道路部 小計				5件	40,946,850	
下管理	下維持	16	高田町排水施設実施設計業務委託(25-1)	千葉市緑区高田町1594番地先	5,117,700	H26. 1. 25 H26. 3. 18
下水道管理部 小計				1件	5,117,700	

※ 自転車：自転車対策課 中・美土木：中央・美浜土木事務所 花・稲土木：花見川・稲毛土木事務所
若葉土木：若葉土木事務所 緑土木：緑土木事務所 下管理：下水道管理部 下維持：下水道維持課

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
下水道建設部	下水道建設課	17	稲毛6号橋外1橋梁詳細設計業務委託	千葉市稲毛区稲毛2丁目地内外1	9,870,000 21,699,300	H25. 3.22 H25. 7.29 H26. 3.22
		18	下水道実施設計業務委託 (マンホールトイレ25-1)	千葉市中央区都町地内外11	3,251,850 3,435,600	H25. 7. 6 H25.11. 2
		19	下水道実施設計業務委託(長洲25-1)	千葉市中央区長洲1丁目地内外3	15,730,050	H25. 7.23 H26. 2.17 H26. 3.13
		20	土質調査業務委託(長洲25-1)	千葉市中央区長洲1丁目地内外3	5,502,000 5,472,600	H25.10.25 H26. 1.12 H26. 1.31
		21	下水道実施設計業務委託(武石25-1)	千葉市花見川区武石町1丁目地内外6	6,633,900	H26. 1.28 H26. 3.22
	下水道再整備課	22	下水道実施設計業務委託(幸町25-2)	千葉市美浜区幸町2丁目地内	3,830,400 4,395,300	H25. 5.24 H25.10.10 H25.11.15
		23	下水道実施設計業務委託(新港25-1)	千葉市美浜区新港地内	7,241,850	H25.11.19 H26. 3.17
		24	下水道実施設計業務委託(新宿25-1)	千葉市中央区新宿2丁目地内外2	8,893,500	H25.11.23 H26. 3.17
		25	下水道実施設計業務委託 (小倉台25-1)	千葉市若葉区小倉台1丁目地内外4	6,046,950	H25.11.23 H26. 3.17
		26	下水道実施設計業務委託(磯辺25-1)	千葉市美浜区磯辺1丁目地内外19	11,419,800	H25.12.19 H26. 3.17
	下施設	27	中央浄化センター再構築実施設計業務委託	千葉市美浜区新港69番地	152,250,000	H25. 9. 5 H26. 3.20
	都市河川課	28	排水施設実施設計業務委託 (宇那谷2号排水路25-1)	千葉市花見川区宇那谷町地内外	7,019,250	H25. 8. 9 H26. 3.18
		29	二級河川坂月川軟弱地盤技術解析業務委託	千葉市若葉区加曽利町地内外	13,637,400	H26. 1.25 H26. 3.25
下水道建設部 小計				13件	251,326,950	
建設局				29件	317,114,700	

※ 下施設：下水道施設建設課

水道局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
1	水道	30	配水管布設実施設計業務委託	千葉市若葉区御殿町地内外2	6,802,950	H25.10. 5 H26. 3.25
水道局				1件	6,802,950	

※ 水道：水道事業事務所
