

令和 7 年第 4 回定例会議案説明資料

- 1 議案第 196 号 議決事件の一部変更について(千葉市下田最終処分場浸出水
処理施設建設工事に係る工事請負契約) P 2

【議案第 196 号】

議決事件の一部変更について
【千葉市下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約】

議案書 P 1 2 2

1 提案理由

千葉市下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約について、令和 7 年第 3 回定例会での補正予算の議決に基づき、工期及び契約金額の変更を行う。

2 工事請負契約の概要

- (1) 工事名称 千葉市下田最終処分場浸出水処理施設建設工事
- (2) 工事概要 プラント設備工事一式、敷地造成工事一式、土木建築工事一式、外構植栽工事一式
- (3) 契約方法 一般競争入札（総合評価落札方式）
- (4) 請 負 者 水 ing エンジニアリング株式会社首都圏支店

3 変更内容

(1) 工期

【変更前】 令和 5 年 3 月 8 日から令和 7 年 12 月 31 日まで（原契約）

【変更後】 令和 5 年 3 月 8 日から令和 8 年 4 月 30 日まで

軟弱地盤である建設地での土工事において、想定を超える降雨により掘削土壌が液性状態となり土質改良等の追加工事により、工程に遅延が生じたため工期延期を行う。

(2) 変更金額 58,973,200 円

【変更前】 2,761,279,400 円（令和 6 年 9 月 17 日議決）

【変更後】 2,820,252,600 円

※参考 原契約 2,679,560,400 円（令和 5 年 3 月 8 日議決）


令和 7 年 4 月に受注者からスライド条項に基づく請求があり、前回スライド請求時（R 5. 6）から今回スライド請求時（R 7. 4）までの約 22 か月の期間において、残工事に対して 8. 49% の物価上昇が認められたため、契約金額の変更を行う。

4 今後の予定

令和 7 年 12 月 本議案議決後、変更契約締結

令和 8 年 4 月 竣工

<参考> 変更工程イメージ図

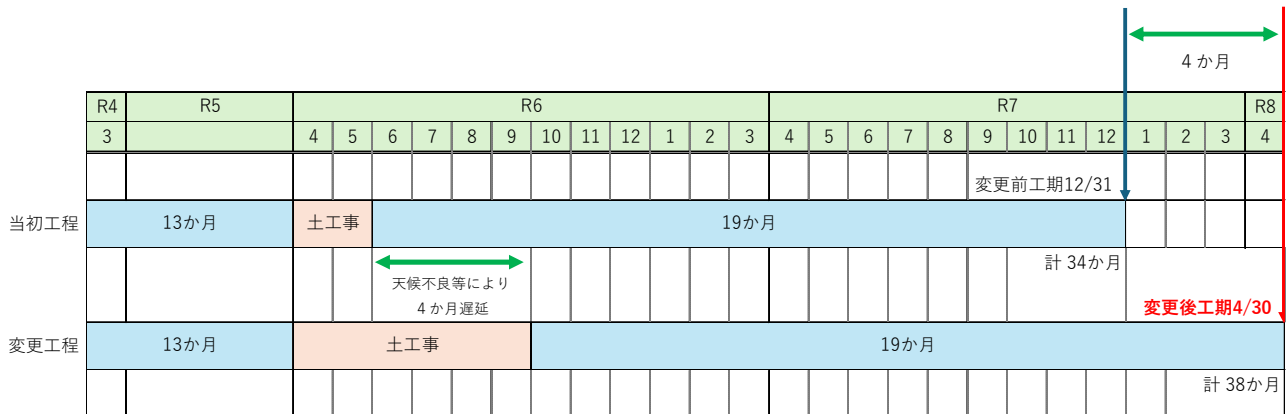

<参考> 物価変動イメージ図

